

Linie: 890  
Bezeichnung: Sargans Ost - Ziegelbrücke  
Projektkilometer: 0.900 - 32.900

08.02.02


Kantone: St. Gallen, Glarus  
Gemeinden: Mels, Flums, Glarus Nord

Projekt: STW-Ersatz Mels, Flums, Weesen

ISP-Nr.: 1160417

Phase: Auflageprojekt

Übersichtsplan:

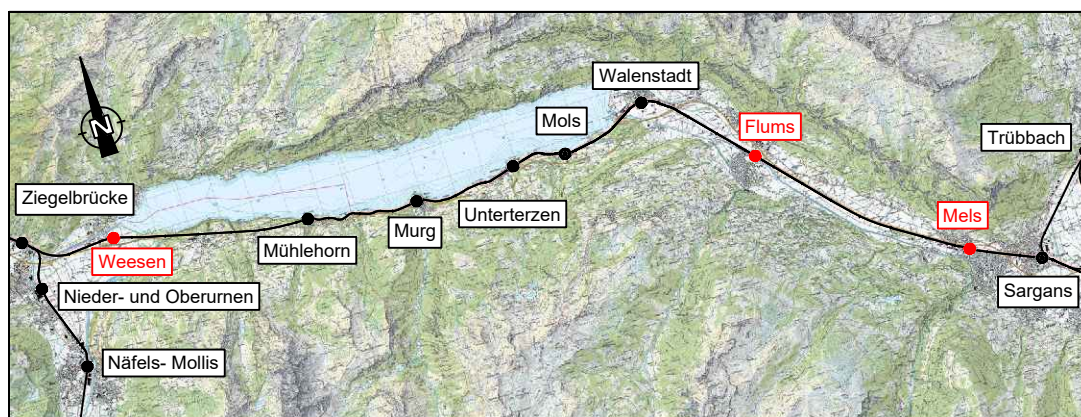

Autoren:

Bauherrenvertretung SBB

Abteilung/OE: I-AEP-PJM-ROT-T6  
Name: Andreas Ziegler

Zürich, 27. Juli 2026



Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht  
Signiert auf Skribble.com

Projektverfasser

Firma: AFRY Schweiz AG  
Name: Carsten Roth

Projektleiter | AFRY Schweiz AG  
Stadthausstrasse 14 | CH-8400 Winterthur, 10. Aug. 2026



Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht  
Signiert auf Skribble.com



SBB CFF FFS

## Flums Schematische Bauphasen

1:2000

Plan Nr. 08.02.02

| Index: | Erstellt: | Vis. | Geprüft: | Vis. | Freigabe: | Vis. |
|--------|-----------|------|----------|------|-----------|------|
| A      | 31.10.25  | sud  | 31.10.25 | wek  | 31.10.25  | roc  |
| B      | 16.03.26  | sud  | 16.03.26 | wek  | 16.03.26  | roc  |
| C      |           |      |          |      |           |      |
| D      |           |      |          |      |           |      |

Filename: 08.02.02\_Schematische\_Bauphasen\_Flums.dwg

Linie: 890

Km: 6.1 - 11.9

Format: 297/1980

SBB AG, Infrastruktur, Ausbau und Erneuerungsprojekte  
Projektmanagement Region Ost, Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

Erstellt auf Basisdaten der amtlichen Vermessung und der SBB-Geodaten® swisstopo® Alle Rechte an diesem Dokument stehen der SBB zu.  
Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der unterirdischen Anlagen besteht keine Gewähr.



8.6 - 11.9



- 7.9



Km 6.1 - 6.8



☐ Bestehende Anlage / Gleise  Betrieb offen  
☐ Grundlagedaten / AV  Personenzugang / Bahnbetrieb geschl.

03.09.2029 - 20.09.2029

| Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen |                                                            | Ausführung Datum:<br>03.09.2029 - 20.09.2029  |           |              | Tiefen      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| Spermuster                                            | Gleis / Weichen                                            | Schichten / Dauer                             | Intervall | FL Ein / Aus | Bemerkungen |
| MF1.1                                                 | 212 – FMS GI 4 – 208 – 204 – MELS GI 4 – 201 ( - SA GI 5 ) | So/Mo - Fr/Sa 22:50 - 05:40                   | 5 Nächte  | aus          |             |
| MF3.1                                                 |                                                            |                                               |           |              |             |
| MF3.2                                                 |                                                            |                                               |           |              |             |
| Logistikgleis                                         | Gleis 40 (Bahnhof Flums)                                   | Reservation Datum:<br>03.09.2028 - 20.09.2028 |           | Länge:       | km 9,4      |


### Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.


|  | <b>AFRY Schweiz AG</b><br>Hessstrasse 12<br>CH - 8048 Zürich<br>Tel +41 44 385 55 55<br><a href="mailto:info.ch@afry.com">info.ch@afry.com</a><br><a href="http://www.afry.ch">www.afry.ch</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Index                                                                               | Beschrieb                                                                                                                                                                                      |
| A                                                                                   | Erstausgabe an Auftraggeber                                                                                                                                                                    |
| B                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| C                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| D                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |




Km 8.6 - 11.9

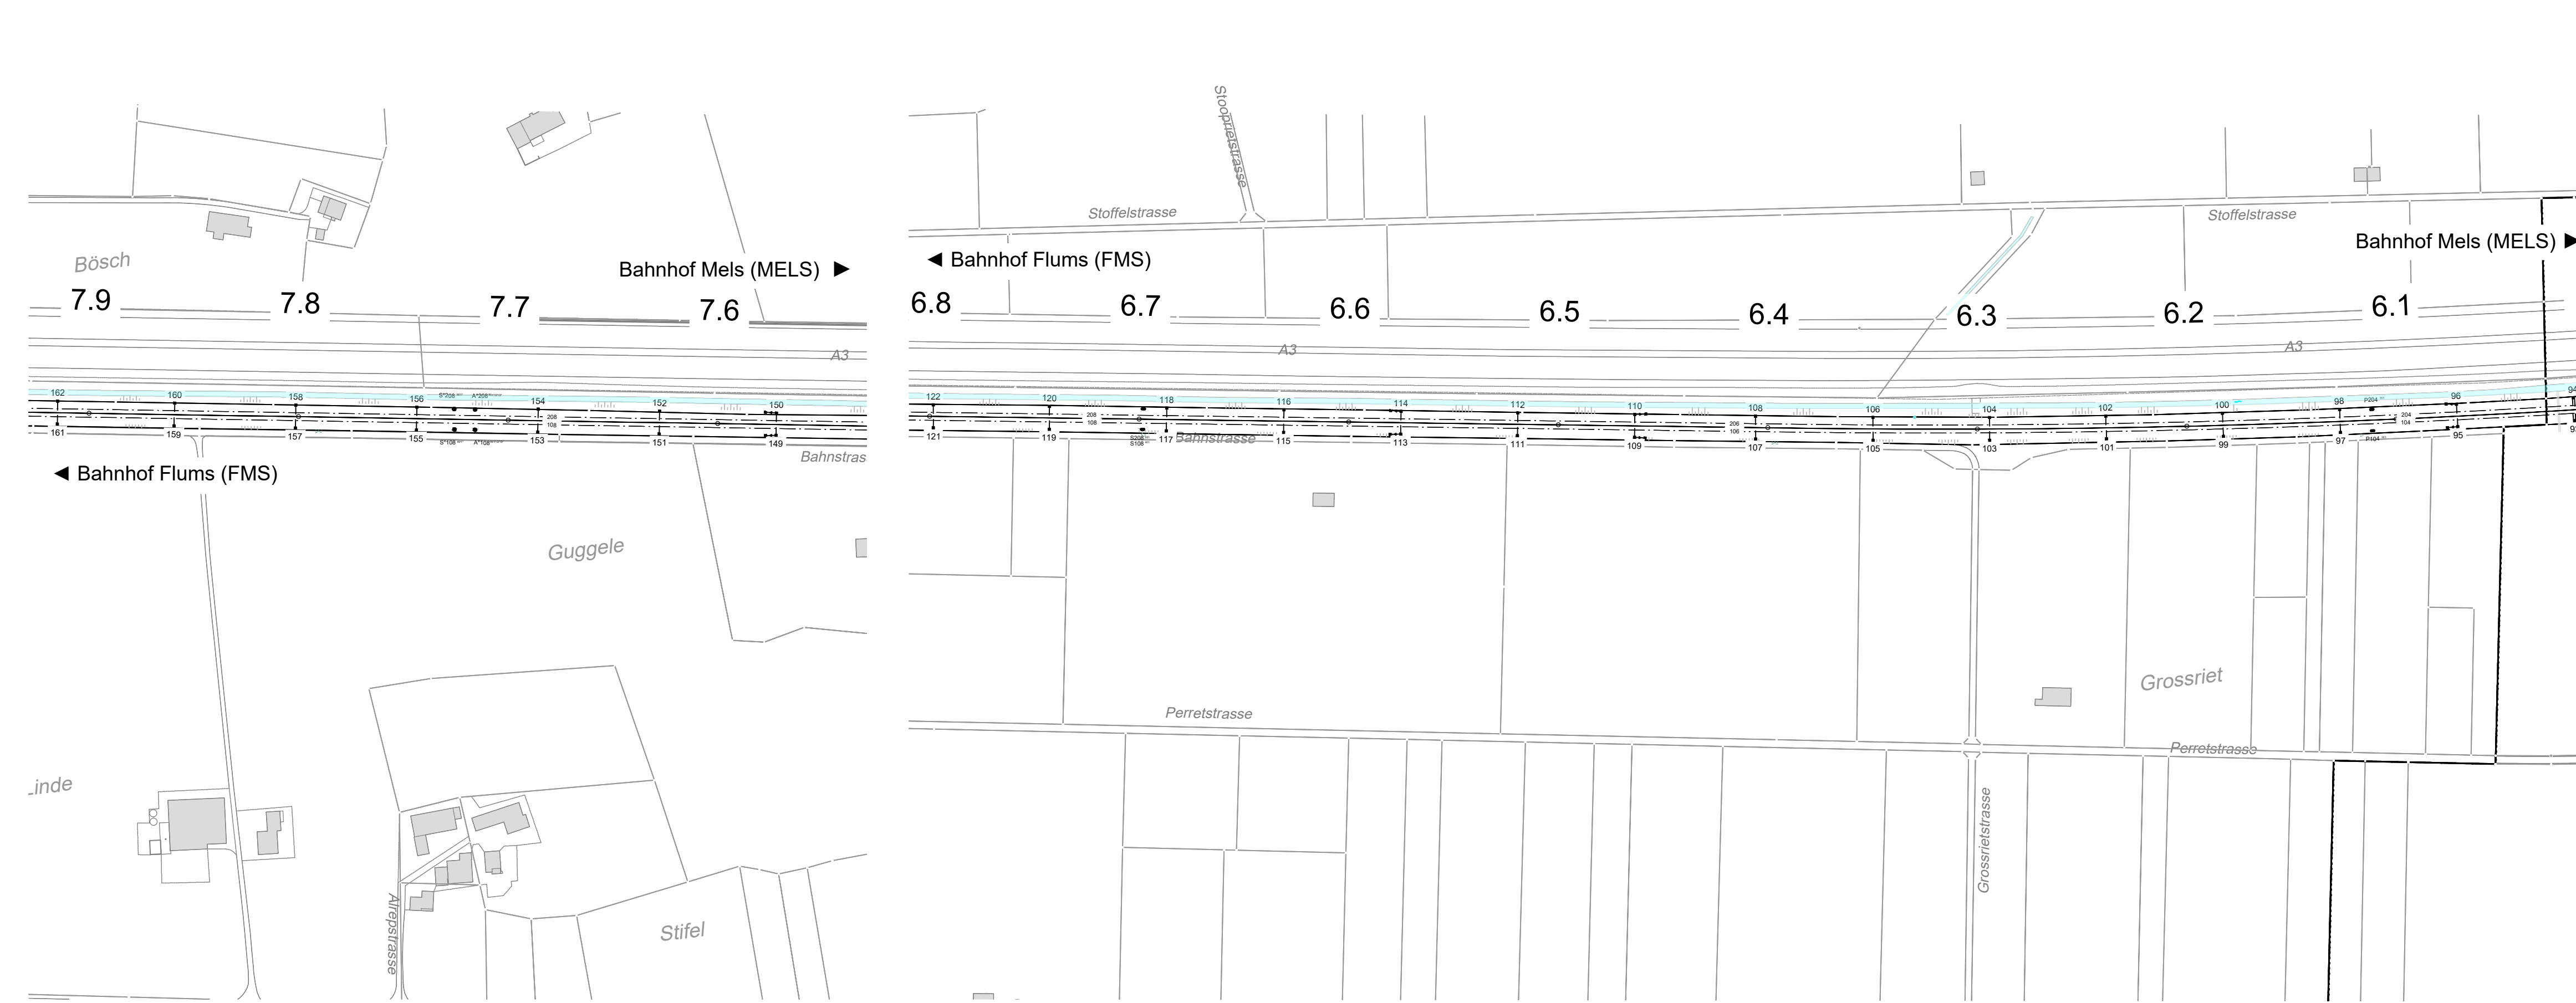

Km 7.6 - 7.9

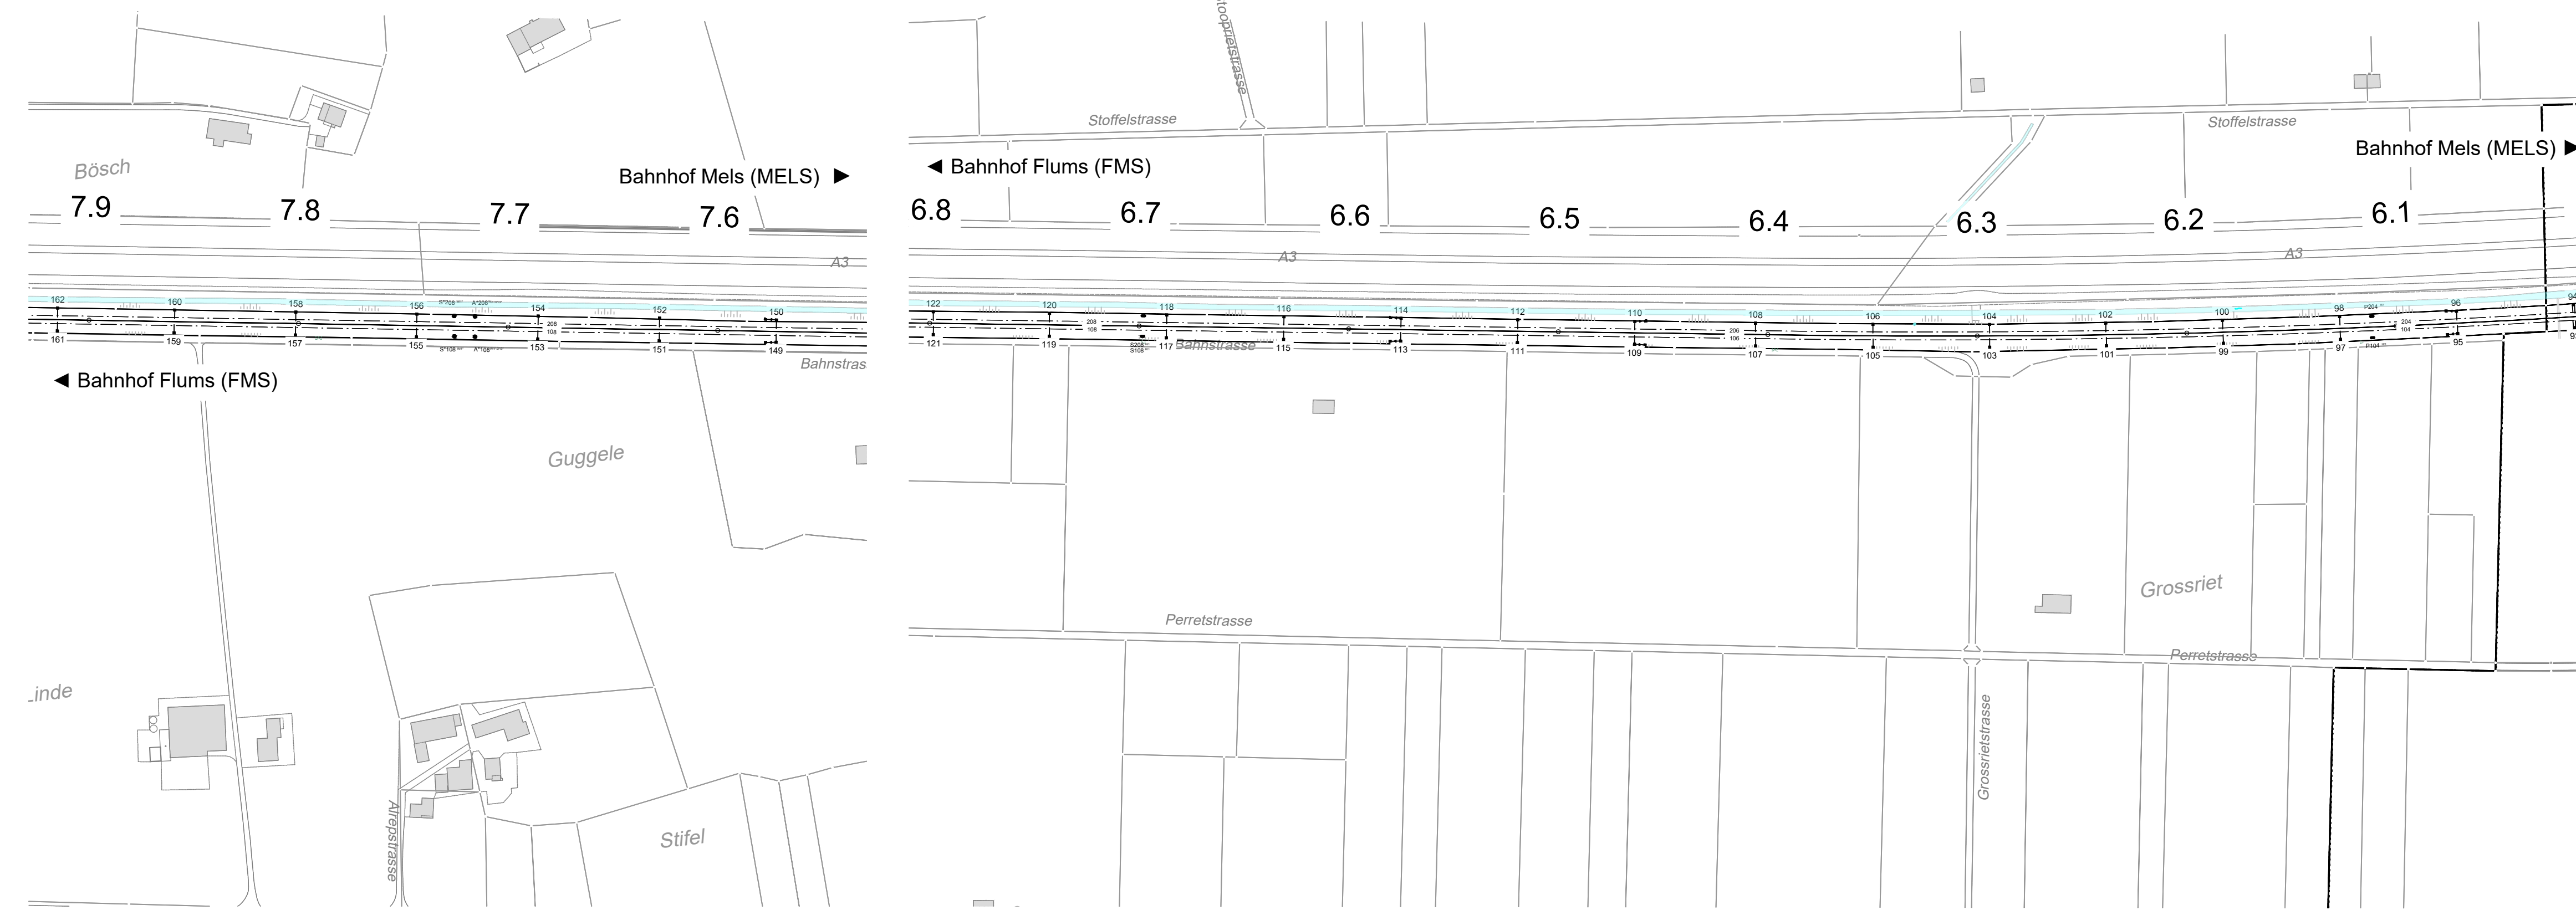

Km 6.1 - 6.8

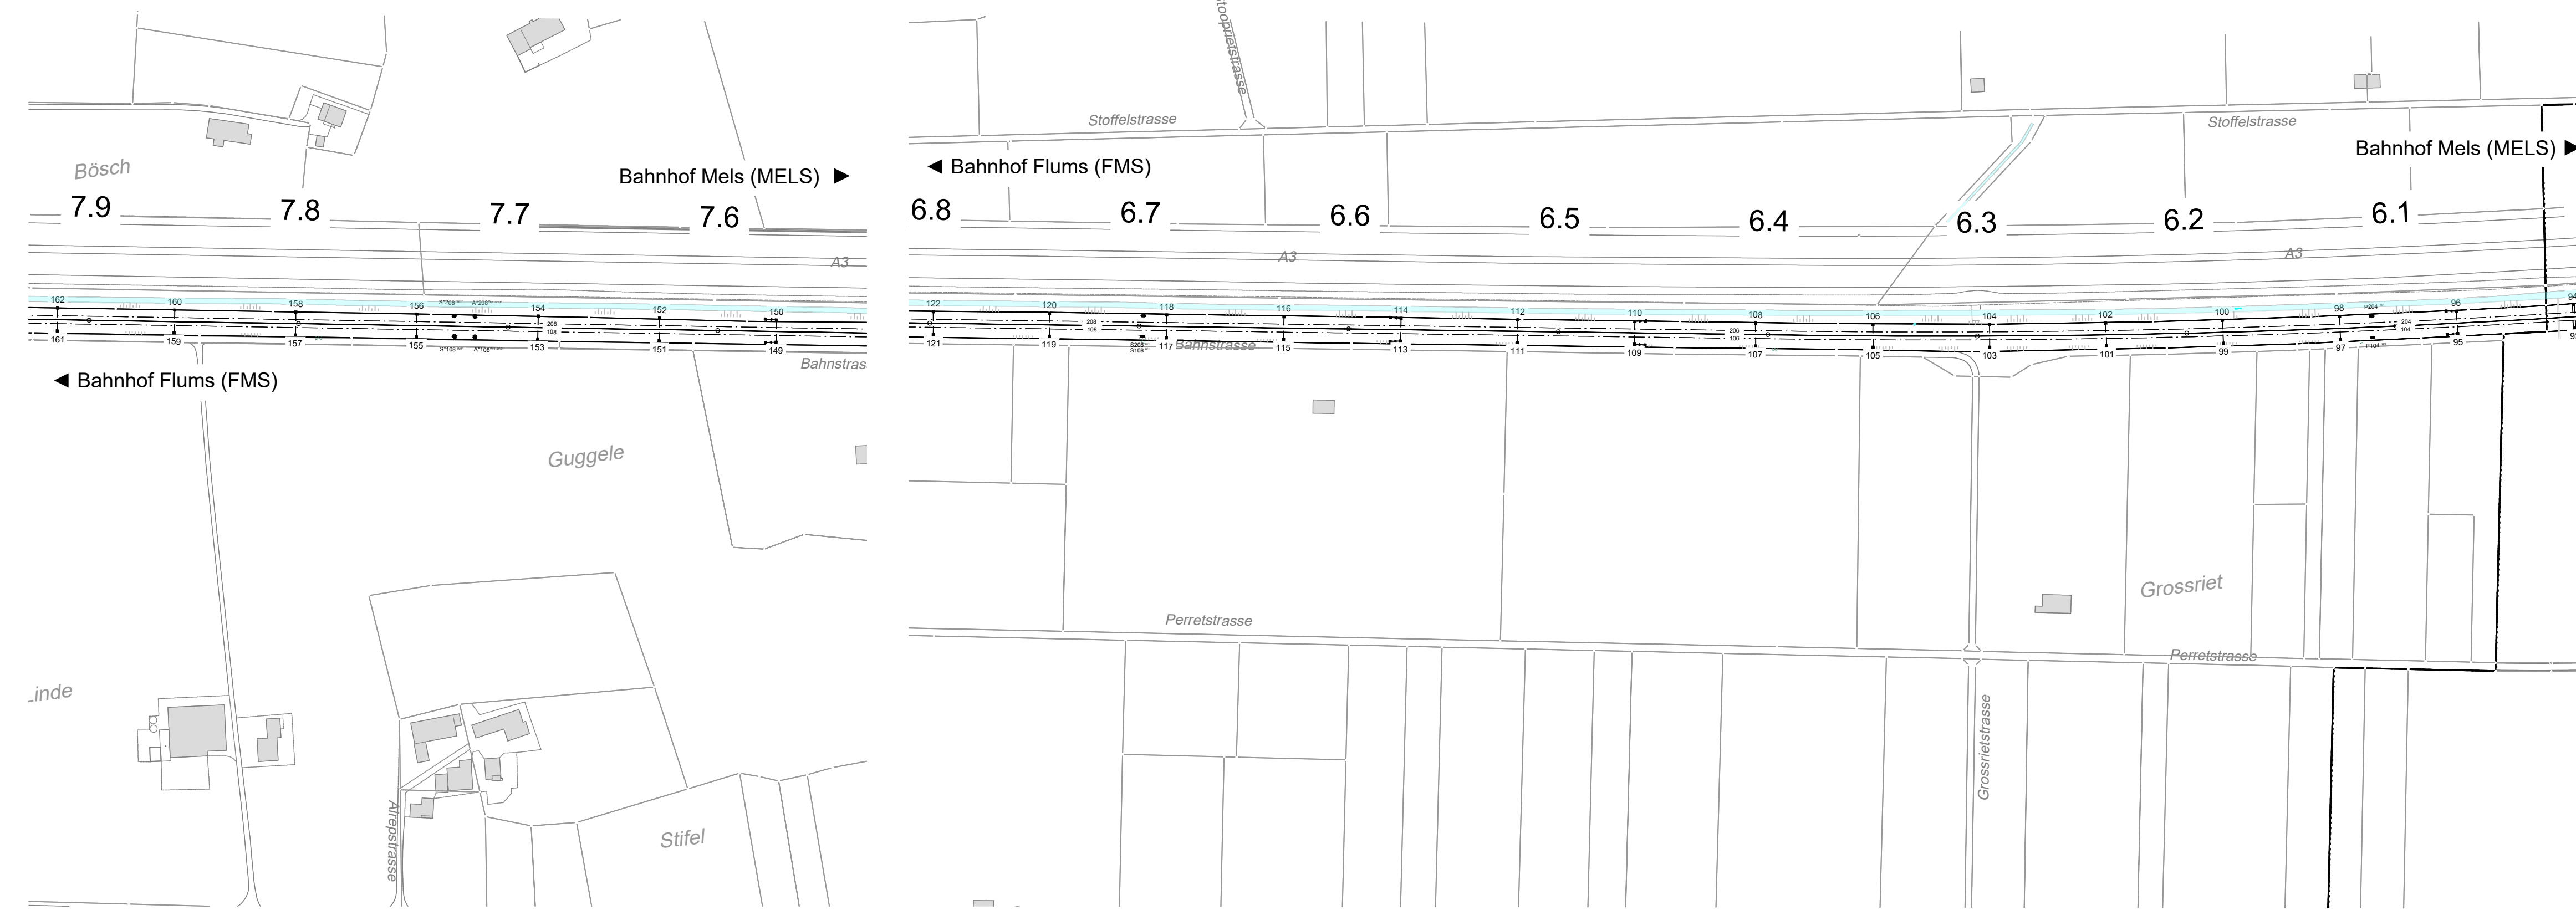

 Bestehende Anlage / Gleise
  Betrieb offen  
 Grundlagedaten / AV
  Personenzugang / Bahnbetrieb geschl.

**06.03.2029 - 30.04.2029**

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.




# AFRY

**AFRY Schweiz AG**  
 Herentstrasse 12  
 CH - 8048 Zurich  
 Tel +41 (0) 44 385 50 55  
 info.ch@afry.com  
 www.afry.ch


| Index | Beschrieb                   |
|-------|-----------------------------|
| A     | Erstausgabe an Auftraggeber |
| B     |                             |
| C     |                             |
| D     |                             |




Bauphase 2.1 - Flums, 1:2000  
Km 8.6 - 11.9



Bauphase 2.1 - Flums, 1:2000  
Km 7.6 - 7.9

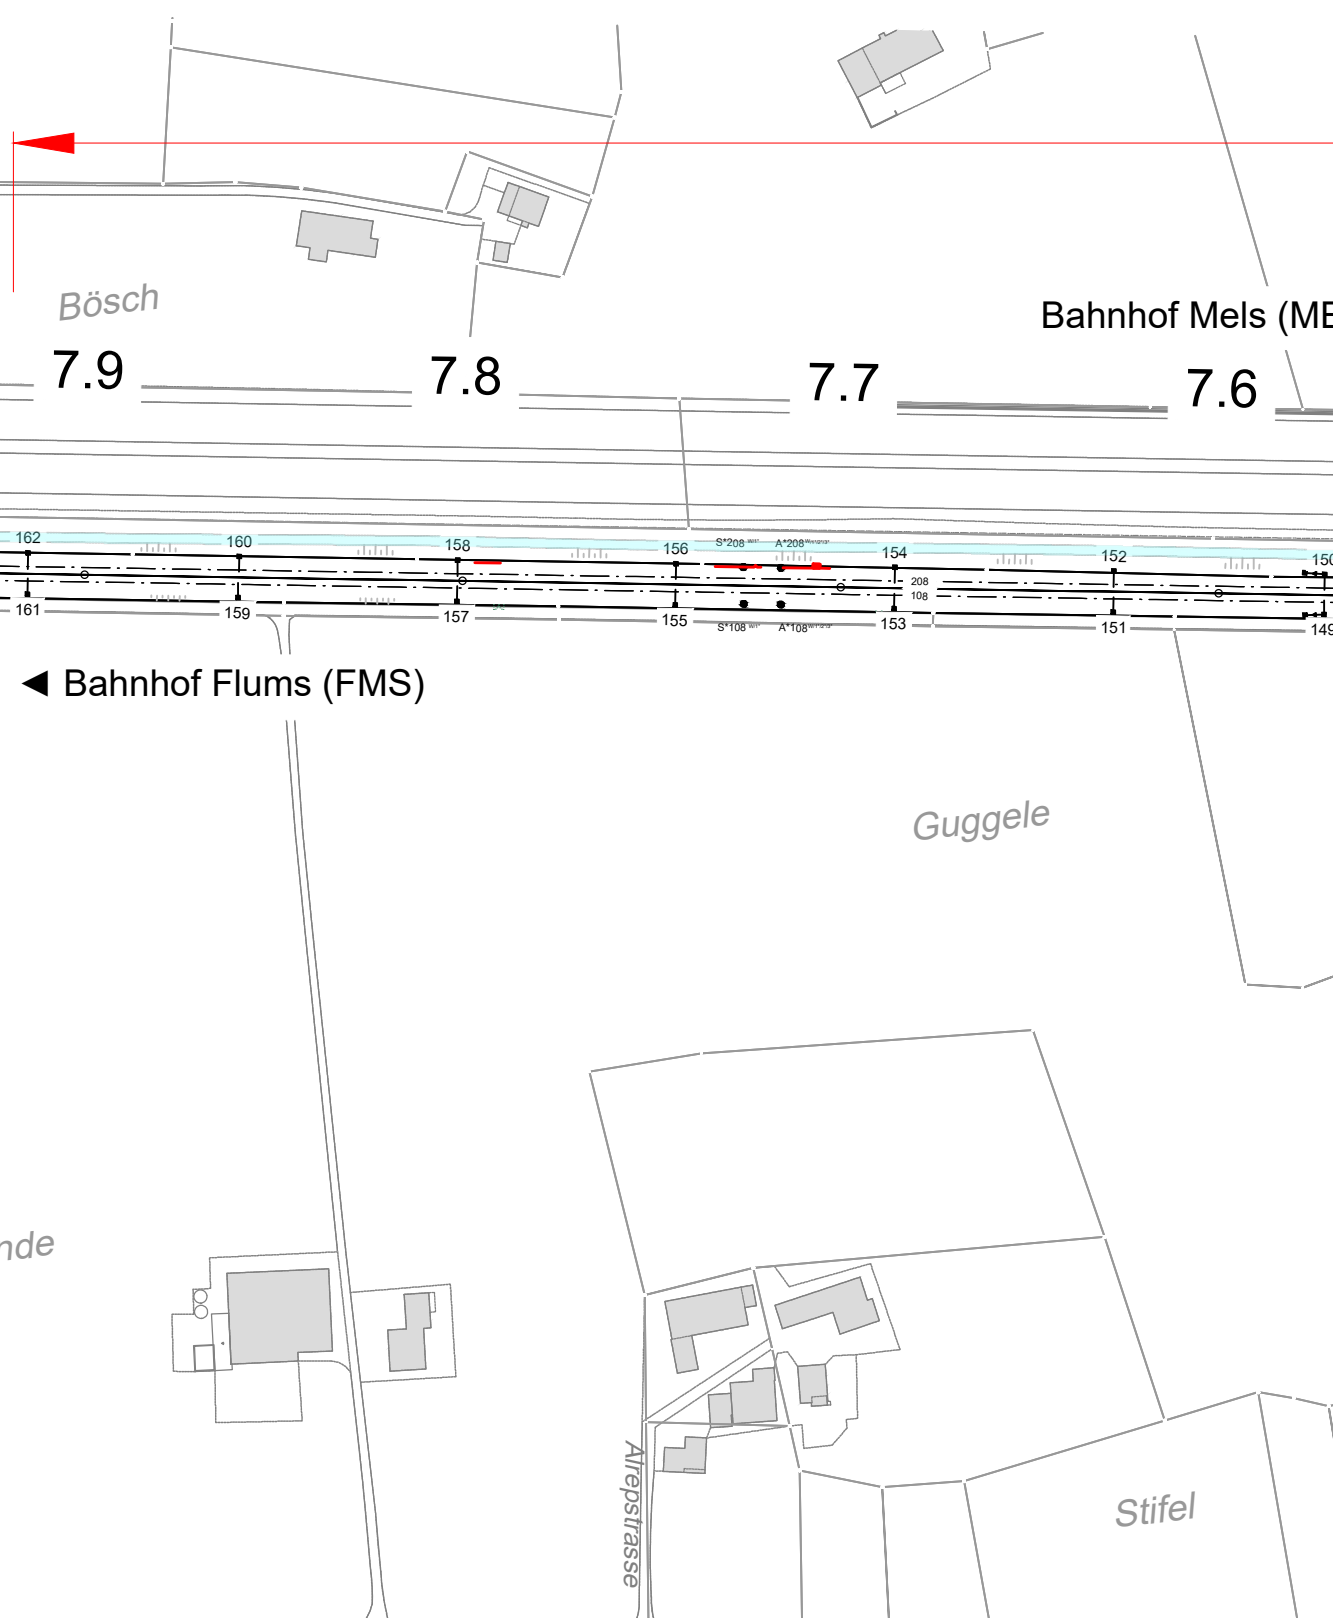

Bauphase 2.1 - Flums, 1:2000  
Km 6.1 - 6.8

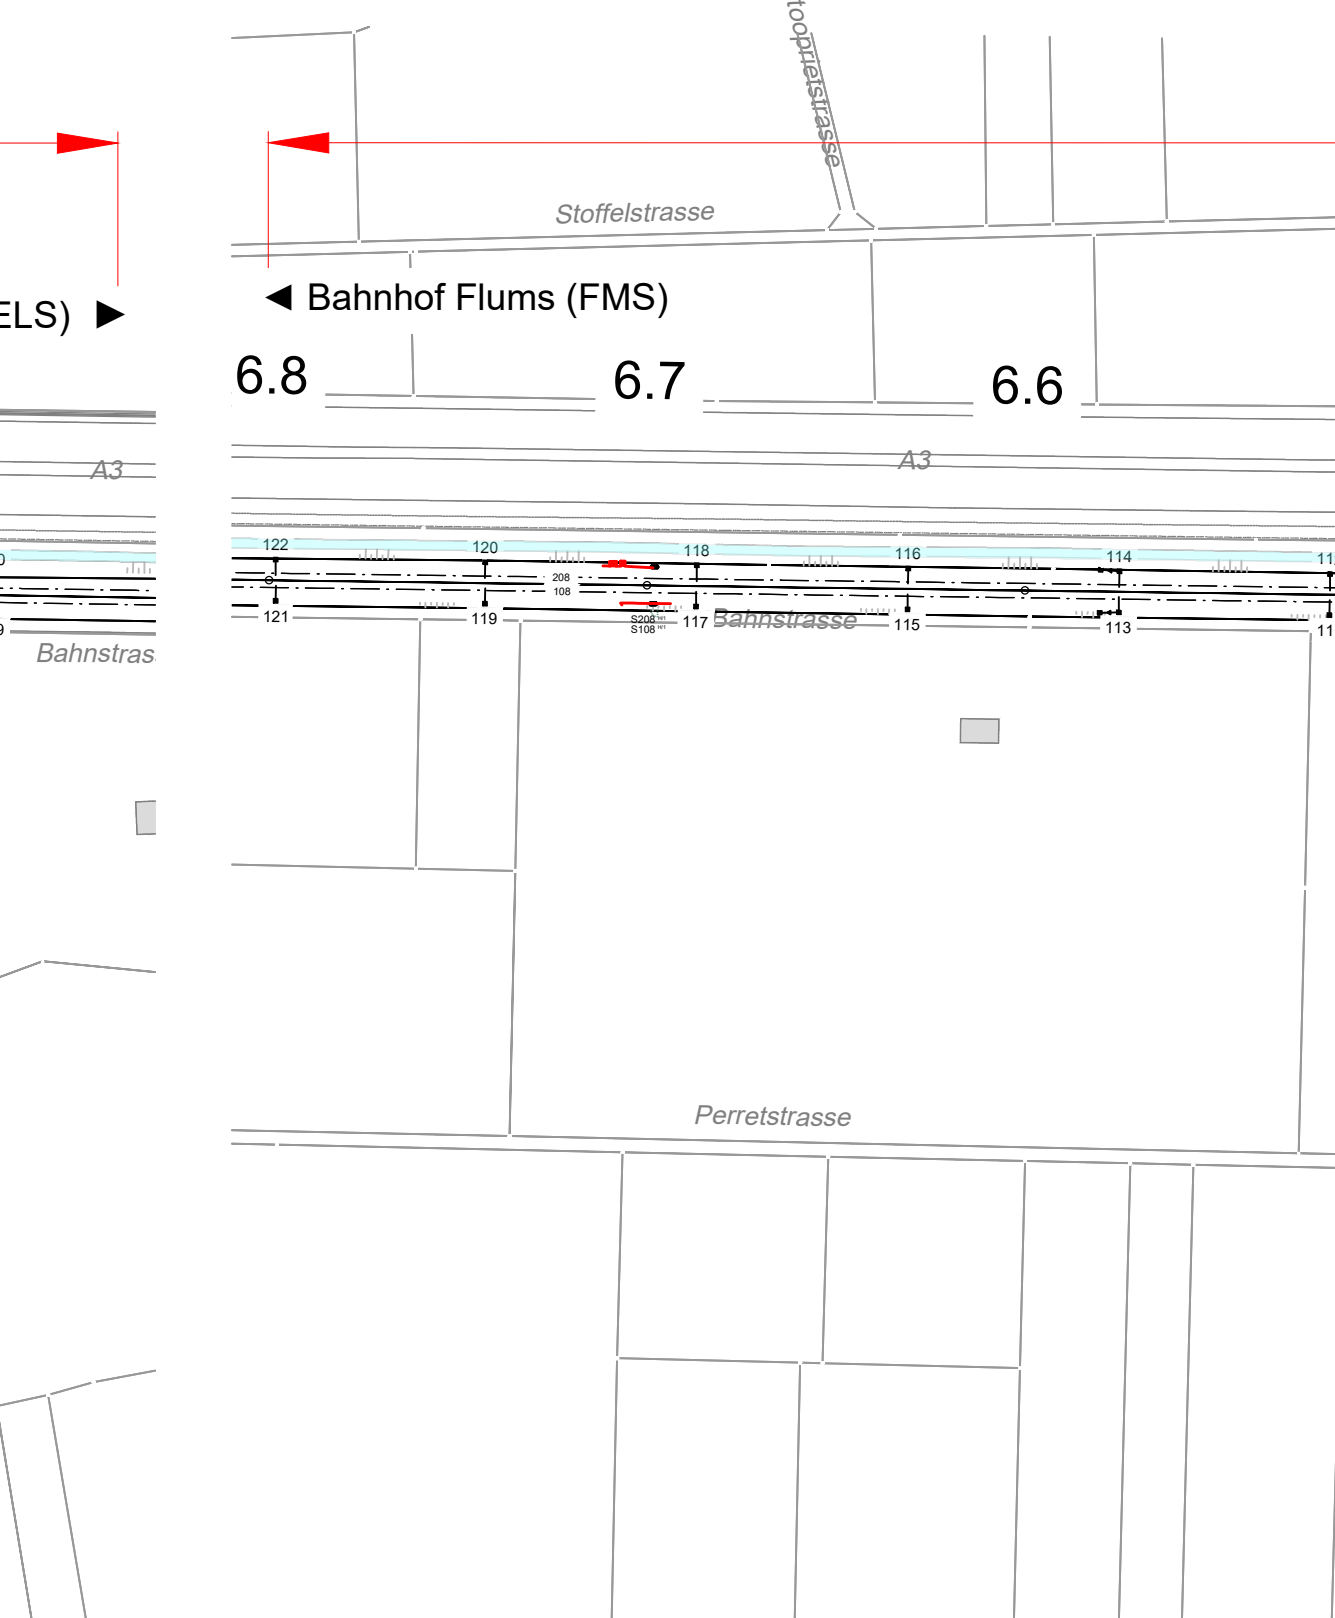

- Teilspernung:**
- S2 - km 6.104 - T22 - 100 (Ersatz)
  - KV-Wanne 160 - km 6.103
  - Bankethalterung km 6.098 bis km 6.118 Einbau Bankethalterung Ribbert Hmax = 80 cm, 100 cm Bankethalterung
  - U100 - km 6.707
  - KV-Wanne 160 - km 6.707
  - KV-Wanne 160 - km 8.836
  - Startgrube Erdrakete km 9.120 erstellen
  - S2 - km 9.120 - T22 - 100
- Teilspernung:**
- KV-Wanne 160 - km 9.237
  - KV-Wanne 160 - km 9.447
  - km 006.112 Abbruch und Neubau Signalfundament P204 (in der Bankethalterung)
  - km 006.698 Neubau Signalfundament S204
  - km 007.718 Neubau Signalfundament A\*208
  - km 007.727 Neubau Signalfundament S\*208
  - km 008.849 Neubau Signalfundament A208
  - km 009.098 Abbruch u. Neubau Fundament Gleis 14
  - km 009.425 Abbruch Signalfundament B4
  - km 009.425 Neubau Signalfundament B4
  - km 9.522 - Ankerfundament M35
- Totalsperrungsarbeiten innerhalb Vollsperrung**
- Zielgrube Erdrakete km 9.120 erstellen
  - S1 - km 9.120-T22 - 100

- BTG Flums Tiefbau (IB)**
- Leitungen und Anschlüsse BTG und Funkmast (TA/TAC/KAB)
  - Bodenplatte schalen, bewehren und betonieren
  - Aushärtungszeit (Frühling)
  - Hinterfüllung Baugrube 2. Etappe Kies 0/45 inkl. Verdichten

**Legende**

|  |                                       |  |                                          |
|--|---------------------------------------|--|------------------------------------------|
|  | Bestehende Anlage / Gleise            |  | Betrieb offen                            |
|  | Grundlagedaten / AV                   |  | Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen |
|  | Neubauten / Gleisabbrüche             |  |                                          |
|  | Neubauten / Gleisbauten (im Bau)      |  |                                          |
|  | Neubauten / neue Gleise erstellt      |  |                                          |
|  | Provisorien / prov. Gleise (im Bau)   |  |                                          |
|  | Provisorien / prov. Gleise (erstellt) |  |                                          |
|  | Drittprojekte                         |  |                                          |

**01.04.2029 - 20.04.2029**

| Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen |                                                                                    | Ausführung Datum: 01.04.2029 - 20.04.2029                                                      |           |              | Tiefbauarbeiten   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------|
| Sperrmuster                                           | Gleis / Weichen                                                                    | Schichten / Dauer                                                                              | Intervall | FL Ein / Aus | Bemerkungen, MIZ  |
| MF2.1                                                 | 101 - MELS GI 3 - 104 - 108<br>- FMS GI 3 - 112 - WAL GI 4)<br>MELS GI 2, FMS GI 2 | So/Mo - Fr/Sa<br>22:50 - 05:30                                                                 | 17 Nächte | aus          |                   |
| MF3.1                                                 |                                                                                    |                                                                                                |           |              |                   |
| MF3.2                                                 |                                                                                    |                                                                                                |           |              |                   |
| Logistikgleis                                         | Gleis 40 (Bahnhof Flums)                                                           | Reservation Datum:<br>01.04.2029 - 29.08.2029<br>Reservation Datum:<br>01.04.2029 - 29.08.2029 |           | Länge:       | km 9.4 bis km 9.6 |
|                                                       | Gleis 41 (Bahnhof Flums)                                                           |                                                                                                |           |              | km 9.4 bis km 9.6 |

**Bemerkungen**

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

**AFRY** Schweiz AG  
Hendriksstrasse 12  
CH - 8048 Zurich  
Tel +41 44 355 55 55  
www.afry.ch

| Index | Beschrieb                   |
|-------|-----------------------------|
| A     | Erstausgabe an Auftraggeber |
| B     |                             |
| C     |                             |
| D     |                             |


X:\3-Büro\Hyp\Bü\_Traupf\15006710\_3132\_2028\_Line\_899\_STW Ersatz Mels Flums Weesen\00\_Prosess\020\_Moedris\03\_Auftraggeber\01\_Plan\_Ausgabe\08.02.02\_Schematische\_Bauphasen\_Flums.dwg



Km 8.6 - 11.9



Km 7.6 - 7.9

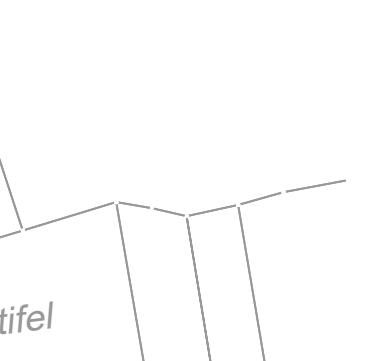

## Km 6.1

|  |            |
|--|------------|
|  | Bestehende |
|--|------------|

- 02.05.2029 - 30.05.2029**

### Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

X:\3-BU\CH\prj\BU\_Transp\115008710\_3132\_S88\_Linie\_800\_STW-Ersatz Mels\_Flums\_Weeseri300\_Process\320\_Models\33\_Auflageprojekt\03\_Plan  
Ausgabe\08.02.02\_Schematische\_Bauskizzen\_Flums.dwg



Km 8.6 - 11.9

Zielgrube km 10.396 Erdrakete  
S1 - km 10.396 - T22 - 100 inkl. T22 (28m)

- km 10.731
- Abbruch (117m ab km 10.70)
- Neubau (117m ab km 10.70)
- Abbruch (850m ab km 10.90)
- Neubau (850m ab km 10.90)
- bau km 10.443 Fundament Gleis 94
- 747 Signalfundament, D\*212

o km 10.132 NW300  
bohrvortrieb NW300  
- km 10.300

## Km 7.6 - 7.9

Km 6.1 - 6.8

- |                                                                                     |                                       |                                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | Bestehende Anlage / Gleise            |  | Betrieb offen                       |
|    | Grundlagedaten / AV                   |  | Personenzugang / Bahnbetrieb gesch. |
|    | Abbrüche / Gleisabbrüche              |                                                                                   |                                     |
|   | Neubauten / Gleisbauten (im Bau)      |                                                                                   |                                     |
|  | Neubauten / neue Gleise erstellt      |                                                                                   |                                     |
|  | Provisorien / prov. Gleise (im Bau)   |                                                                                   |                                     |
|  | Provisorien / prov. Gleise (erstellt) |                                                                                   |                                     |
|  | Dritprojekt                           |                                                                                   |                                     |

**03.06.2029 - 03.07.2029**


| Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen |                                                                                                                          | Ausführung Datum: 03.06.2029 - 03.07.2029                                                                                                      |              | Tiefbau:        |                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|
| Spermu<br>ster                                        | Gleis / Weichen                                                                                                          | Schichten / Dauer                                                                                                                              | Intervall    | Fl Ein<br>/ Aus | Bemerku<br>ng                     |
| MF1.1                                                 | 212 – FMS Gl 4 – 204 – 204 –<br>MELS Gl 4 – 201 (c-SA Gl 5)                                                              | So/Mo – Fr/Sa 22:50 – 03:30                                                                                                                    | 49<br>Nächte | ein             |                                   |
| MF3.1                                                 | 212 – FMS Gl 4 – 204 – 204 –<br>MELS Gl 4 – 201, 101 – MELS Gl 3<br>– 104 – 108 – FMS Gl 3 – 112,<br>MELS Gl 2, FMS Gl 2 | Nacht Sa/Sa: 01:30 – 04:30 Uhr<br>Nacht So/Mo 01:30 – 03:30 –<br>03:50 – 04:30 Uhr<br>Nacht Mo/Di – Fr/Sa 02:30 –<br>03:30 / 03:45 – 04:30 Uhr | 10<br>Nächte | aus<br>Sa/So    | Längsma-<br>ssen:<br>(05.06.2029) |
|                                                       | 212 – FMS Gl 4 – 204 – 204 –<br>MELS Gl 4 – 201, 101 – MELS Gl 3<br>– 104 – 108 – FMS Gl 3 – 112,<br>MELS Gl 2, FMS Gl 2 | So/Mo – Fr/Sa 00:30 – 04:30                                                                                                                    | 3<br>Nächte  | aus             |                                   |
| Logistik-<br>gleis                                    |                                                                                                                          | Reservation Datum:<br>01.04.2029 - 29.08.2029                                                                                                  |              | Länge:          | km 9.4                            |
|                                                       | Gleis 41 (Bahnhof Flums)                                                                                                 | Reservation Datum:<br>01.04.2029 – 29.08.2029                                                                                                  |              | Länge:          | km 9.4                            |

### Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.









8.6 - 11.9



- 7.9

Km 6.1 - 6.8

|                                                                                   |                            |                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Bestehende Anlage / Gleise |  | Betrieb offen                        |
|  | Grundlagedaten / AV        |  | Personenzugang / Bahnbetrieb geschl. |

| Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen |                                     | Ausführung Datum:<br>14.07.2029 - 09.10.2029  |           | Tiefbau      |                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Spermuster                                            | Gleis / Weichen                     | Schichten / Dauer                             | Intervall | FL Ein / Aus | Bemerkung           |
| MF1.1                                                 | 204, 208, FMS: 14, 4, 94, 212       | So/Mo - Fr/Sa 22:50 - 05:30                   | 3 Nächte  | ein          | 26.07.2029          |
| MF1.1                                                 | FMS: 4, 94, 212WAL: 13, 24, 4       | So/Mo - Fr/Sa 22:50 - 05:30                   | 3 Nächte  | ein          | 03.09.2029          |
| MF1.1                                                 | FMS: 4                              | So/Mo - Fr/Sa 22:50 - 05:30                   | 6 Nächte  | ein          | 08.08.2029          |
| MF1.1                                                 | FMS: 24                             | So/Mo - Fr/Sa 22:50 - 05:30                   | 1 Nacht   | aus          | 03.09<br>Schalter 1 |
| MF1.1                                                 | FMS: 24                             | So/Mo - Fr/Sa 22:50 - 05:30                   | 1 Nacht   | aus          | 08.09<br>Schalter 1 |
| MF1.1                                                 | FMS: 4                              | So/Mo - Fr/Sa 22:50 - 05:30                   | 3 Nächte  | aus          | 06.09.2029          |
| Logistikgleis                                         | Gleis 40 oder 41<br>(Bahnhof Flums) | Reservation Datum:<br>14.07.2029 - 30.09.2029 |           | Länge:       | km 9.4              |
|                                                       | Verladegleis:<br>757 und (Sargans)  | Reservation Datum:<br>14.07.2029 - 30.09.2029 |           |              | mind                |
|                                                       | Abstellgleis: 867, oder 37          |                                               |           |              |                     |

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

|                                                                                                              |                             |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <b>AFRY</b> </div> |                             | <b>AFRY Schweiz AG</b><br>Hauptstrasse 12<br>CH - 8048 Zurich<br>Tel +41 44 355 55 55<br><a href="mailto:info.ch@afry.com">info.ch@afry.com</a><br><a href="http://www.afry.ch">www.afry.ch</a> |
| Index                                                                                                        | Beschrieb                   |                                                                                                                                                                                                 |
| A                                                                                                            | Erstausgabe an Auftraggeber |                                                                                                                                                                                                 |
| B                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| C                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                 |
| D                                                                                                            |                             |                                                                                                                                                                                                 |



Bauphase 4.2 - Flums, 1:2000  
Km 8.6 - 11.9



**BTG Flums Ausbau Technische Anlagen (FD TA)**  
-Installationen / Verkabelungen im BTG  
-Erstprüfung Elektro Installationen  
-Abschlussarbeiten / Fertiginstallationen  
-Schlusskontrolle und unabhängige Kontrolle  
-Abschluss / Mängelbehebung / Abnahme TA  
-Umschaltungen Perron und Gleisfeld mit KAB  
-BTG bereit für Ausbau/Betrieb SAZ  
-Demontagen und Rückbauten im AG


**Kabelverlegung und Anschluss BTG (FD KAB)**  
Aufschaltung Flums BTG, Gleisfeld und Perron

**Erstellen Muffenschächte Strecke (FD KAB)**  
Deponieren Material Abbruch Kanal  
Neubau Muffenschacht

Bauphase 4.2 - Flums, 1:2000  
Km 7.6 - 7.9



Bauphase 4.2 - Flums, 1:2000  
Km 6.1 - 6.8

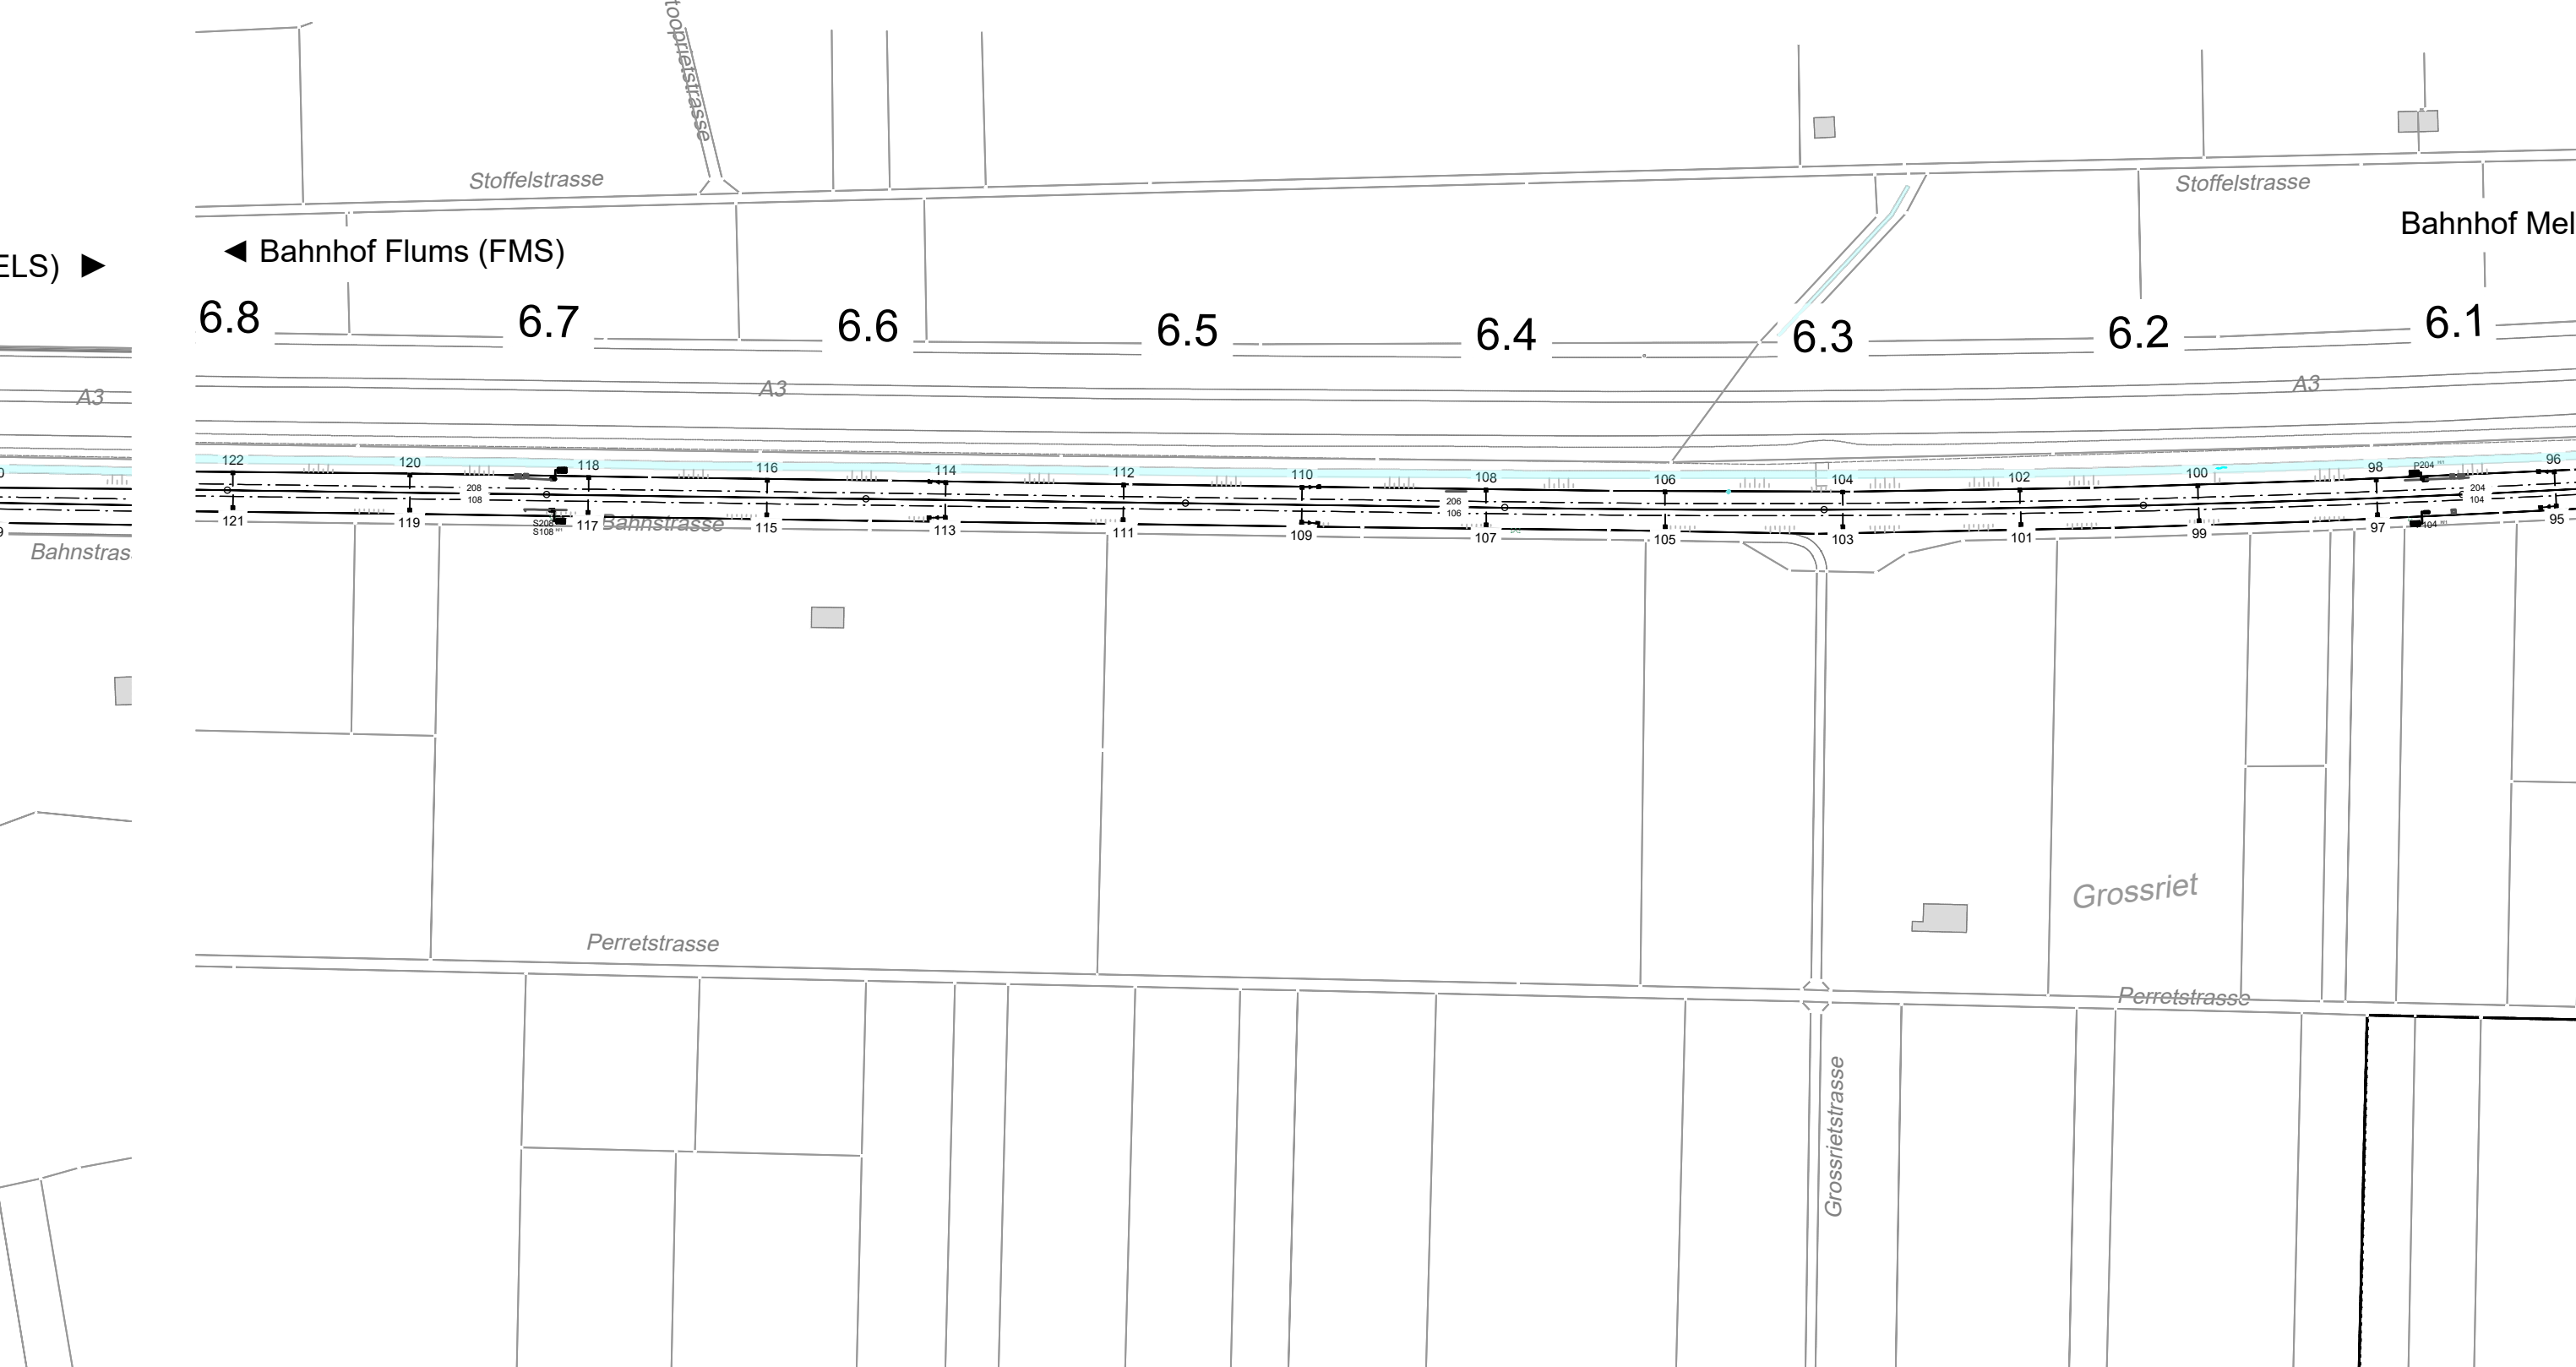

- Legende**
- Bestehende Anlage / Gleise
  - Grundlagedaten / AV
  - Abbrüche / Gleisabbrüche
  - Neubauten / Gleisbauten (im Bau)
  - Neubauten / neue Gleise erstellt
  - Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
  - Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
  - Drittprojekte
  - Betrieb offen
  - Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

**05.09.2029 - 22.01.2029**

| Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen | Ausführung Datum: 05.09.2029 - 22.01.2029                 | Tiefbauarbeiten                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sperrmuster                                           | Gleis / Weichen                                           | Schichten / Dauer                           |
| MF1.1                                                 | 204, 208, FMS: 14, 4, 94, 212                             | So/Mo - Fr/Sa 22.50 - 05.30                 |
|                                                       | Gleis 40 oder 41 (Bahnhof Flums)                          | Reservations Datum: 14.01.2030 - 20.01.2030 |
| Logistikgleis                                         | Verladegleis: 757 und (Sargans) Abstellgleis: 867 oder 37 | Länge: km 9.4 bis km 9.6                    |
|                                                       |                                                           | Länge: mind 80 m.                           |

**Bemerkungen**

Die Bauphasenablauplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.


AFRY Schweiz AG  
Hersingstrasse 12  
CH - 8043 Zurich  
Tel +41 44 355 55 55  
info.ch@afry.com  
www.afry.ch

| Index | Beschrieb                   |
|-------|-----------------------------|
| A     | Erstausgabe an Auftraggeber |
| B     |                             |
| C     |                             |
| D     |                             |



# Bauphase 5.1 - Flums, 1:2000

Km 8.6 - 11.9



- BTG Mels Ausbau Sicherungsanlagen (FD SAZ)**
- eStw Werkprüfung Labor (Zeitfenster)
  - eStw SIOP B Labor (Zeitfenster)
  - Technikräume TC/Strömversorgung ILOK-Schrank
  - Technikräume TC anschliessen an Achszähler
  - Montage Innenanlagen eStw (Siemens)
  - Montage Innenanlage gängig machen (Siemens)
  - Montage Innenanlagen eStw Lieferung ILOK-Schränke (Siemens)
  - Montage Innenanlagen Achszähler Lieferung Schränke (Thales)

- 22 Mastsignale
  - 1 Signalkabel mit 1 Signal
  - 7 Nachtintervalle
- Montage Aussenanlage Signale stellen (Nachtintervall)  
Montage Aussenanlage allgemein  
Achszähler einstellen und in Betrieb nehmen (Thales), tagsüber  
MSTT Inbetriebsetzung (Siemens), tagsüber  
Signale prüfen (gleichzeitig mit MSTT-Inbetriebsetzung)  
Balisen-Programmierung (Siemens), tagsüber  
Werkprüfungen eStw vor Ort inkl. allfällige Fehlerbereinigung eStw (Siemens)


# Bauphase 5.1 - Flums, 1:2000

Km 7.6 - 7.9



# Bauphase 5.1 - Flums, 1:2000

Km 6.1 - 6.8

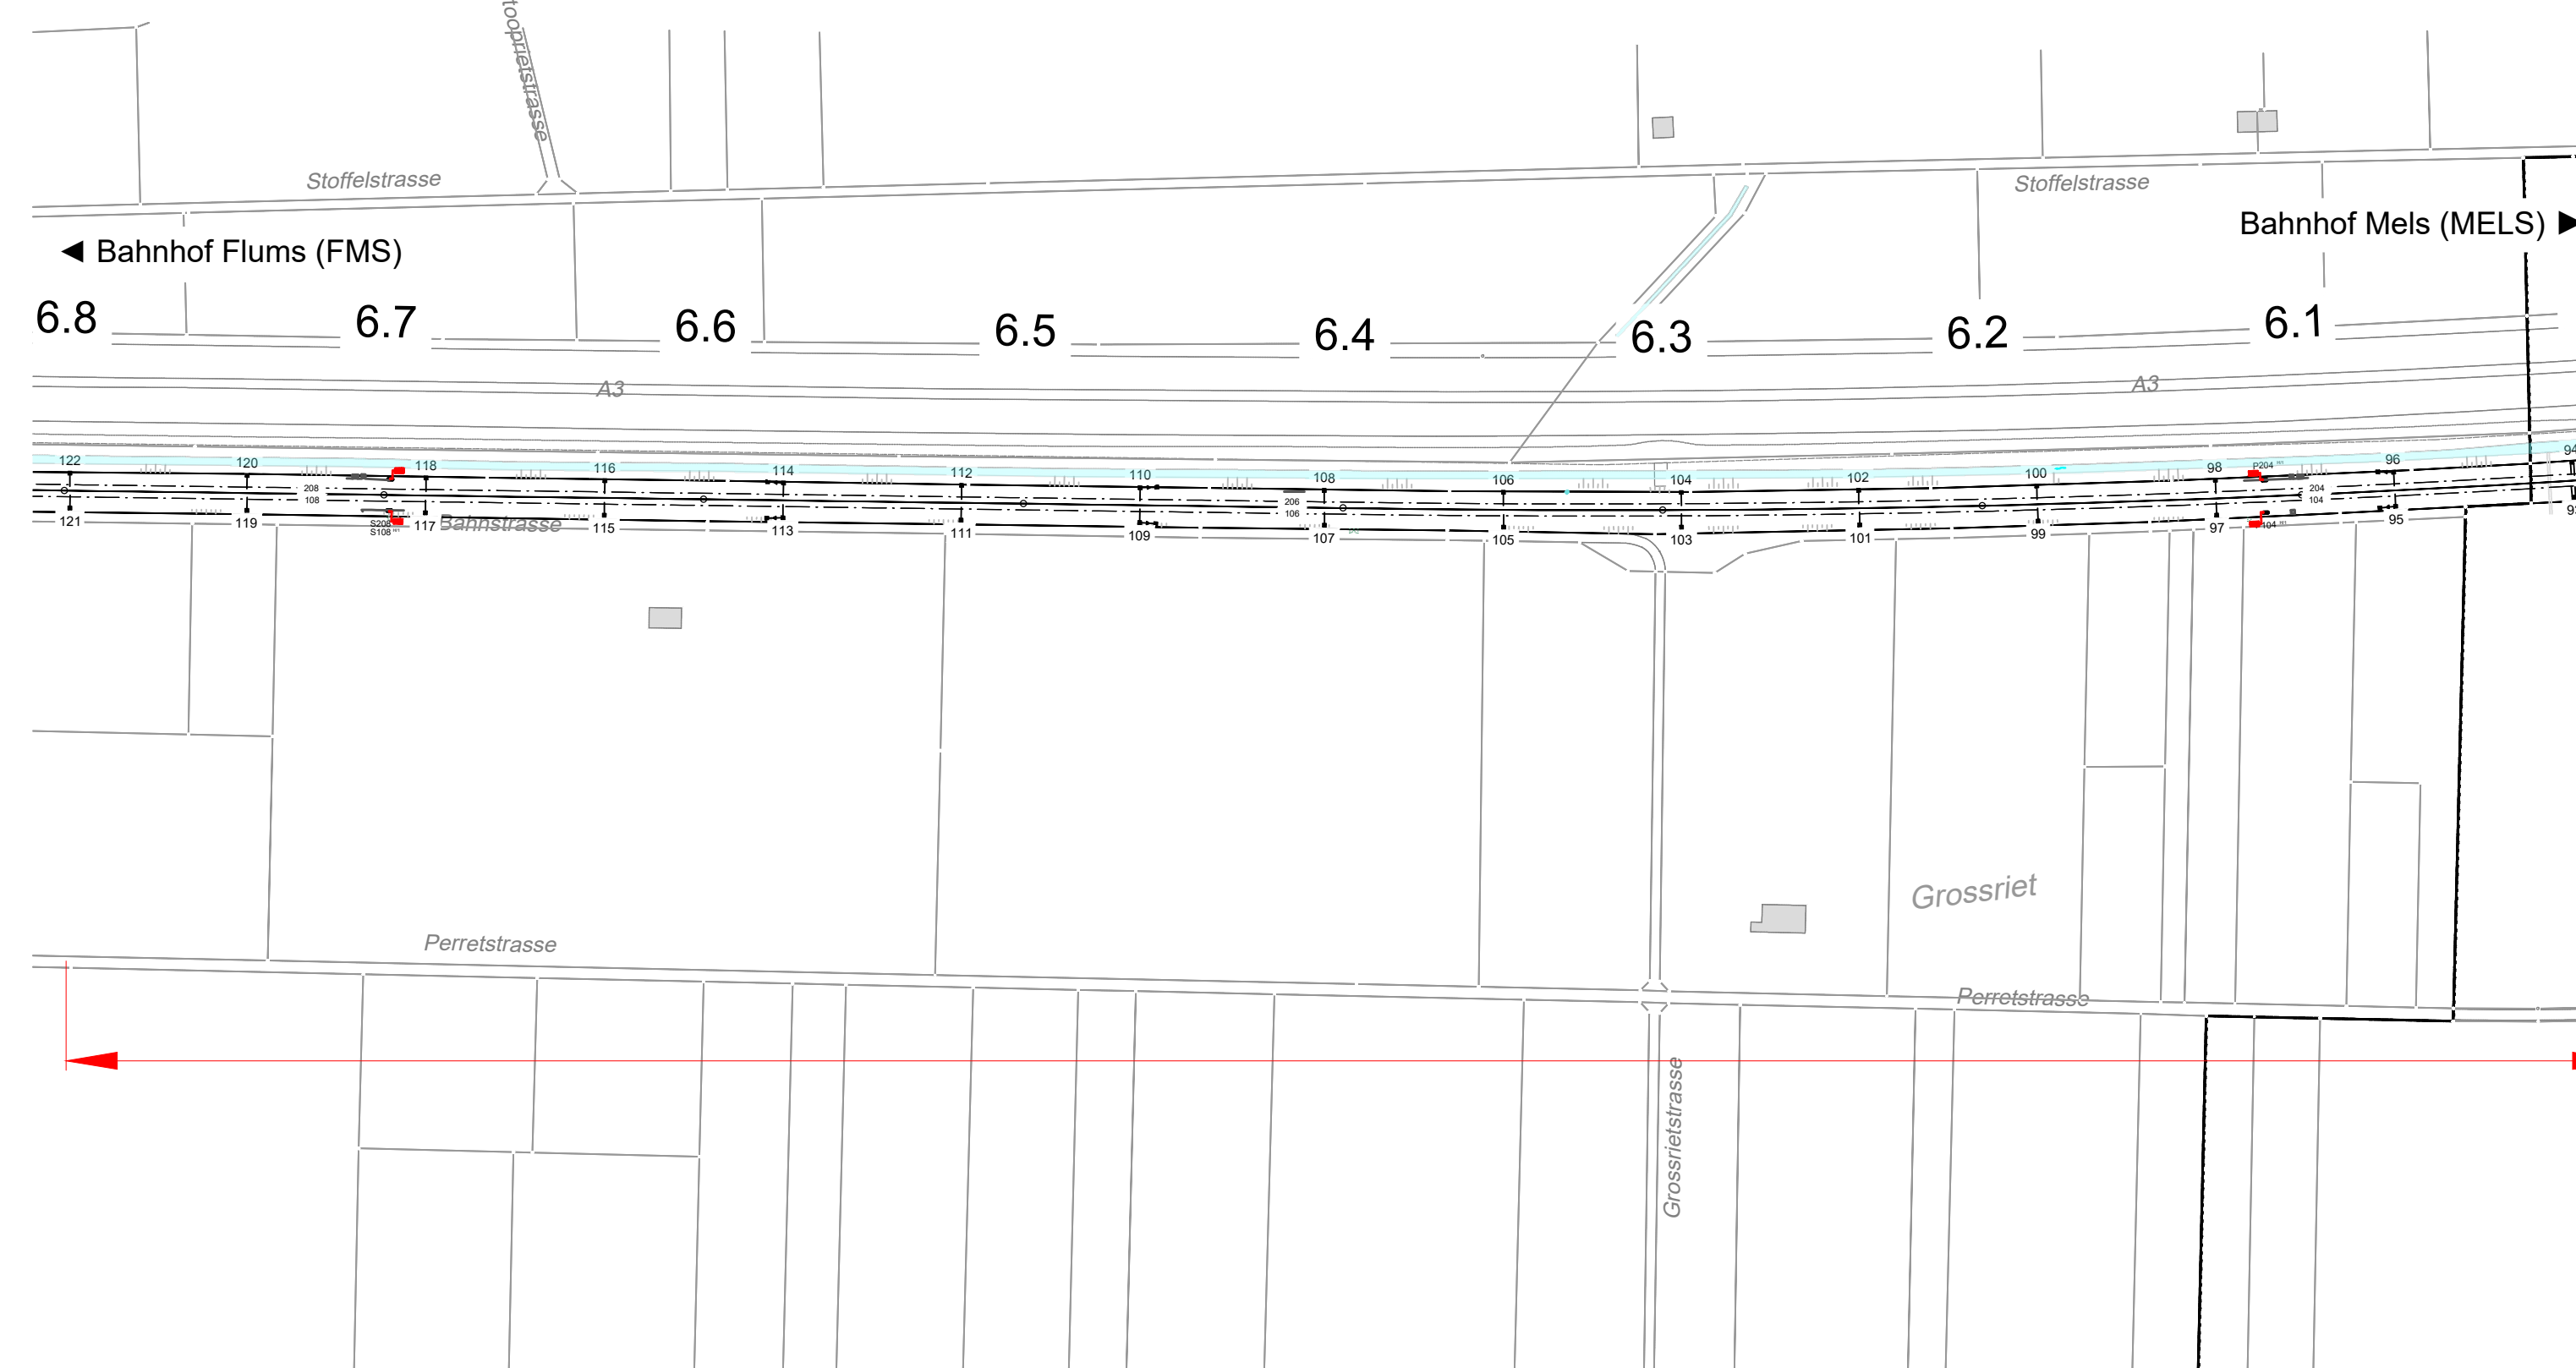

- Legende**
- Bestehende Anlage / Gleise
  - Abbrüche / Gleisabbrüche
  - Neubauten / neue Gleise erstellt
  - Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
  - Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
  - Drittprojekte
  - Betrieb offen
  - Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

**01.04.2030 - 06.12.2030**  
**Intervall-Muster «1h Einspur, 4h Totalsperre, 1h Einspur»**  
**Signale stellen (Zeitraum April - Juni 2030)**  
- FMS 5 Nächte  
**Montage Aussenanlage-Elemente** Achszähler, Zwergsignale etc. sowie Balisen-Programmierung (Zeitraum April - Juni 2030)  
- FMS 5 Nächte  
**Werkprüfung und SIOP** Innen- und Aussenanlage inkl. Blöcke zu Nachbaranlagen (Zeitraum Mitte Oktober - Mitte November 2030)  
- FMS 5 Nächte

| Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Wiesen |                                                           | Ausführung Datum: 01.04.2030 - 06.12.2030                               |           | Tiefbauarbeiten |                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| Spernmuster                                           | Gleis / Weichen                                           | Schichten / Dauer                                                       | Intervall | FL Ein / Aus    | Bemerkungen, MIZ  |
| MF1.1 oder MF2.1                                      | Gesamter Abschnitt                                        | So/Mo - Fr/Sa 22:50 - 05:30                                             | 10 Nächte | aus             | siehe Legende     |
| MF 3.2                                                | Gesamter Abschnitt                                        | So/Mo - Fr/Sa 00:30 - 04:30                                             | 10 Nächte | aus             | siehe Legende     |
| Logistikgleis                                         | Gleis 40 oder 41 (Bahnhof Flums)                          | Reservations Datum: 01.04.2030 - 30.06.2030 und 15.10.2030 - 15.11.2030 |           | Länge:          | km 9.4 bis km 9.6 |
|                                                       | Verladegleis: 757 und (Sargans) Abstellgleis: 967 oder 37 | Reservations Datum: 01.04.2030 - 30.06.2030 und 15.10.2030 - 15.11.2030 |           | Länge:          | mind 80 m.        |

**Bemerkungen**  
Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RaiSys.

AFRY Schweiz AG  
Hersingstrasse 12  
CH - 8048 Zürich  
Tel +41 44 355 55 55  
info@afry.com  
www.afry.ch


| Index | Beschrieb                   |
|-------|-----------------------------|
| A     | Erstausgabe an Auftraggeber |
| B     |                             |
| C     |                             |
| D     |                             |

X:\3-Büro\Hyp\Bü\_Traup\115006710\_3132\_SBB\_Line\_899\_STW Ersatz Mels Flums Wiesen\030\_Prozess\020\_MoMo\33\_Auftragsgutachten\_Plan\_Ausgabe\02.02.02\_Schematische\_Bauphasen\_Flums.dwg



Bauphase 5.2 - Flums, 1:2000

Km 8.6 - 11.9




Bauphase 5.2 - Flums, 1:2000

Km 7.6 - 7.9



Bauphase 5.2 - Flums, 1:2000

Km 6.1 - 6.8

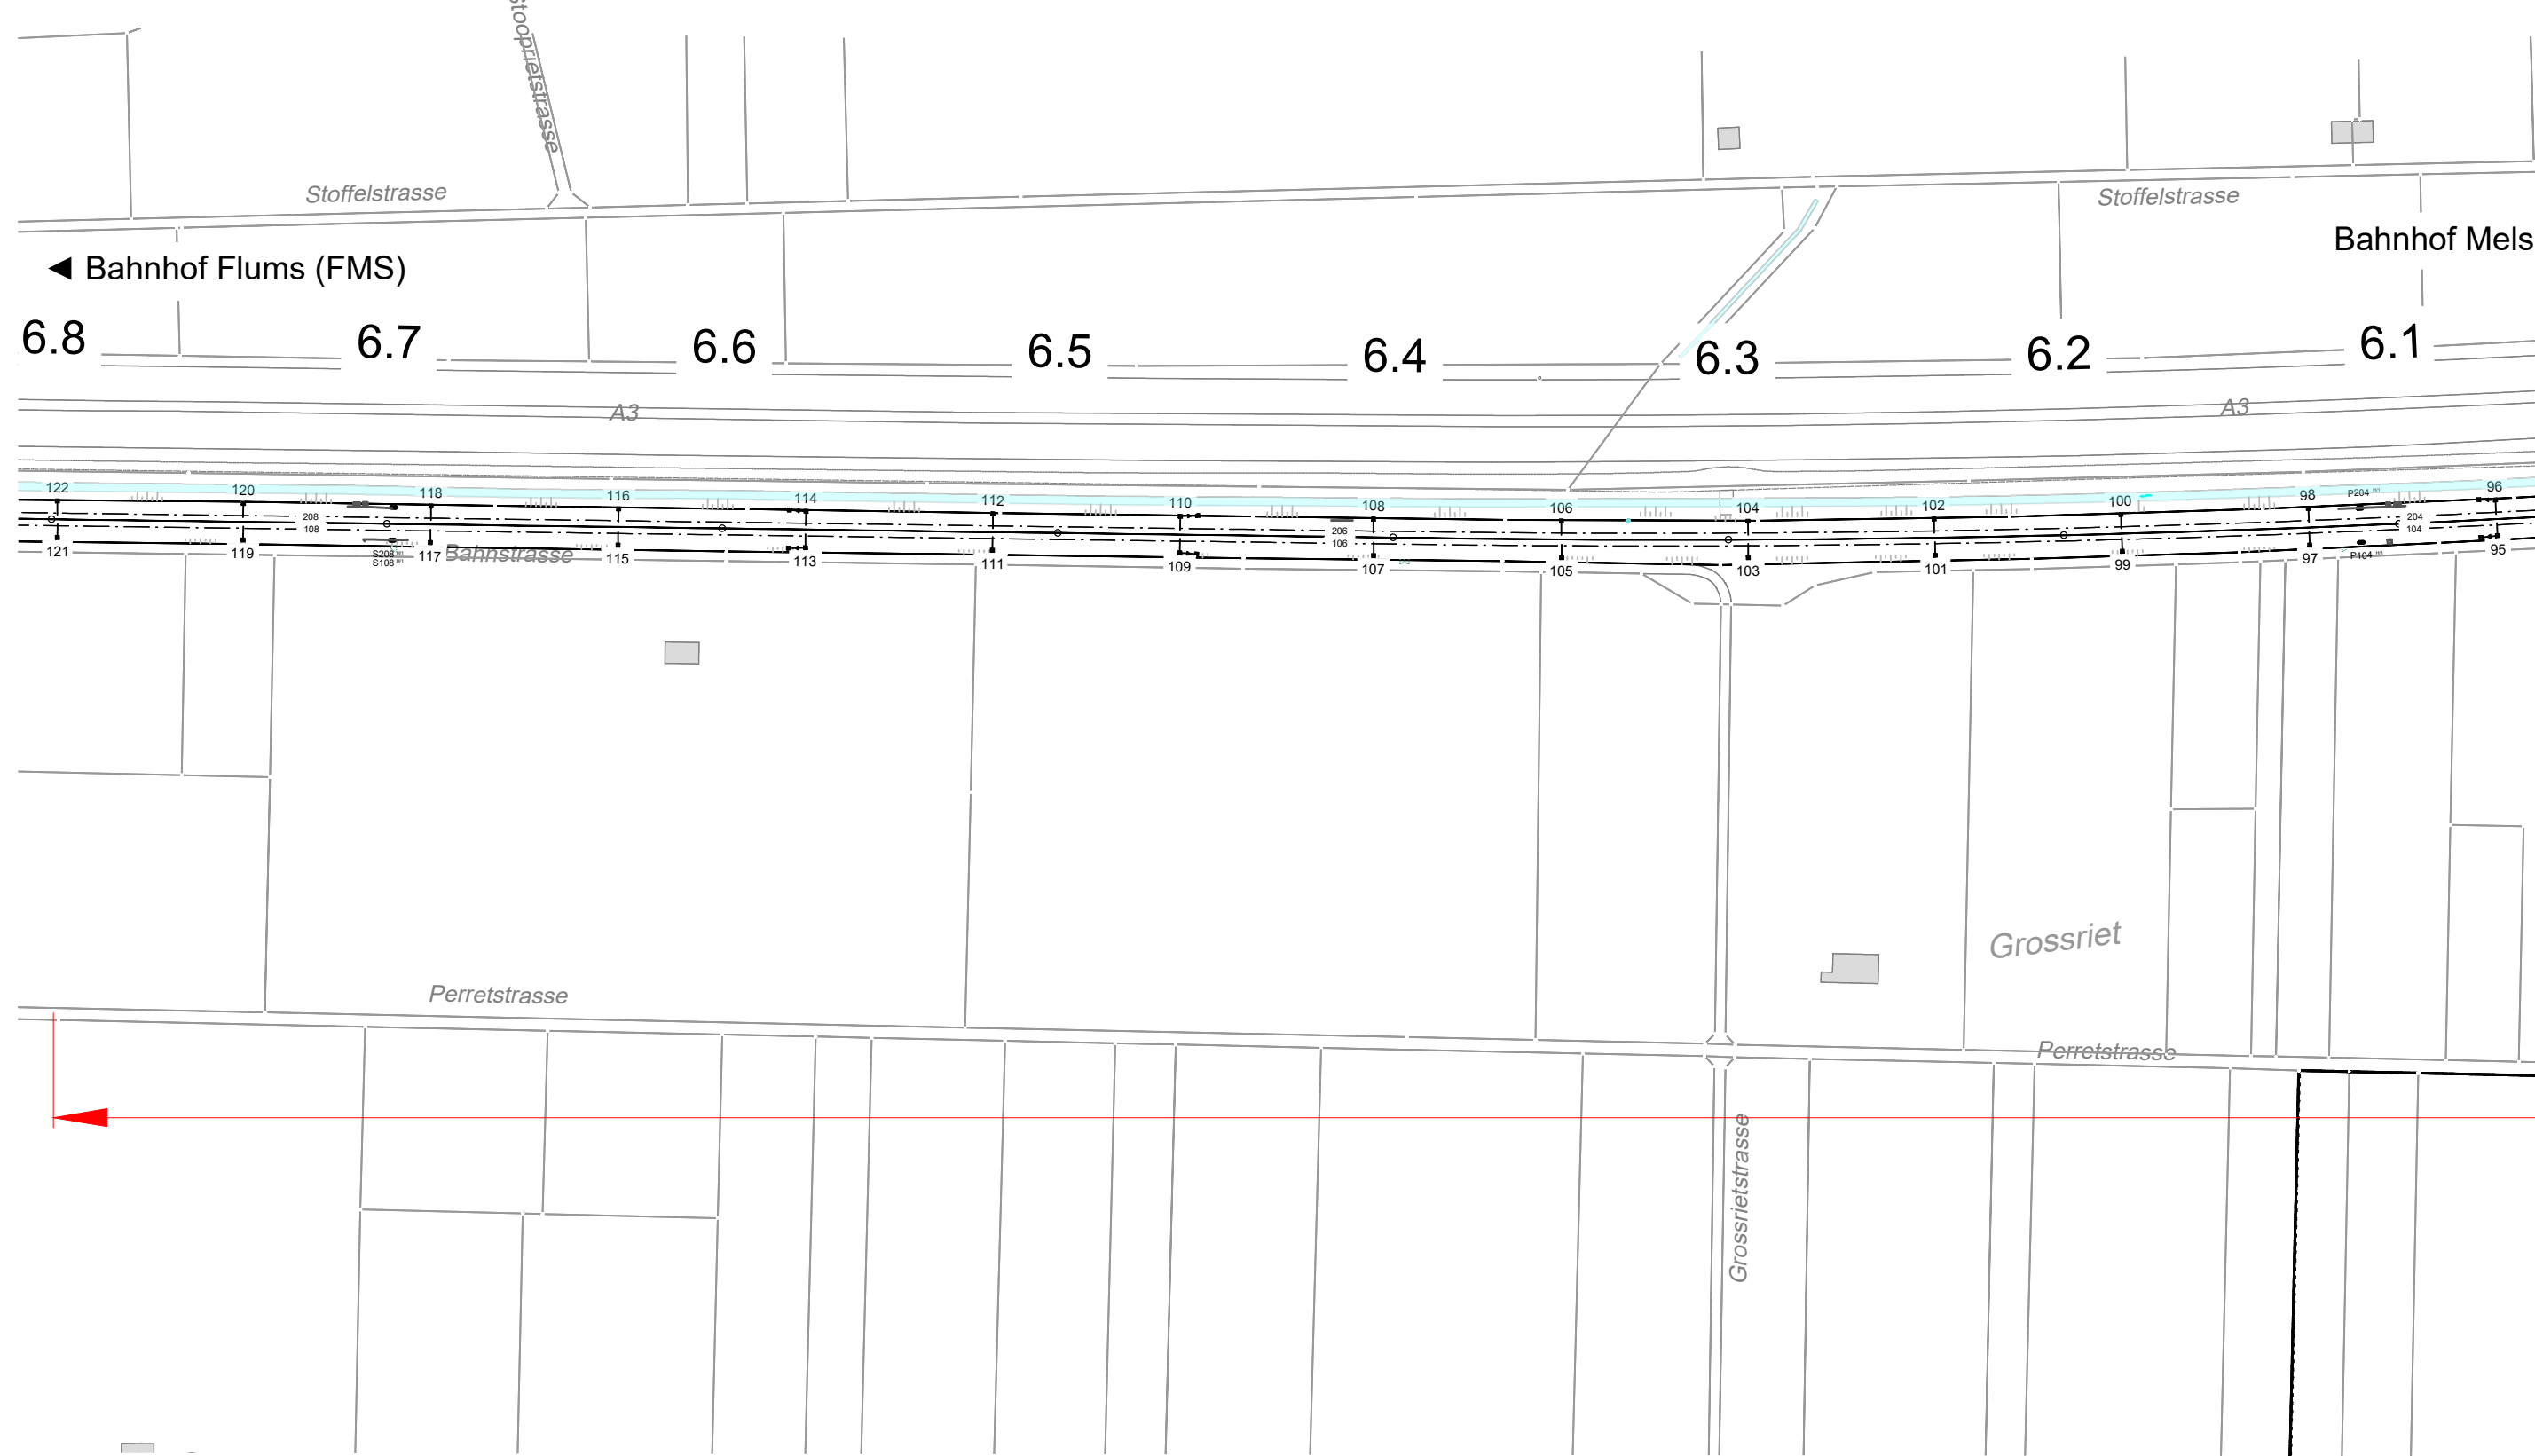

Legende

- Bestehende Anlage / Gleise
- Abbrüche / Gleisabbrüche
- Neubauten / Gleisneubauten (im Bau)
- Neubauten / neue Gleise erstellt
- Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
- Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
- Drittprojekte
- Betrieb offen
- Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

07.12.2030 - 09.12.2030

| Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen |                                                           | Ausführung Datum: 07.12.2030 - 09.12.2030                                               |           | Tiefbauarbeiten |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Sperrmuster                                           | Gleis / Weichen                                           | Schichten / Dauer                                                                       | Intervall | FL Ein / Aus    | Bemerkungen, MIZ                                      |
| spezial                                               | Neben- und Abstellgleise                                  | Sa Morgen - Mo Morgen durchgehend kein Betrieb                                          | aus       |                 | Gesamter Abschnitt (Umschaltarbeiten)                 |
| spezial                                               | Totalsperre                                               | So Abend - Mo Morgen: 1h Einspur, 6h Totalsperre SA - ZB (ganzer Abschnitt), 1h Einspur | aus       |                 | Bahnernsatz und ggf. Umschaltarbeiten sind vorzusehen |
| Logistikgleis                                         | Gleis 40 (Bahnhof Flums)                                  | Reservation Datum: 01.12.2030 - 03.12.2030                                              |           | Länge:          | km 9.4 bis km 9.6                                     |
|                                                       | Verladegleis: 757 und (Sargans) Abstellgleis: 867 oder 37 | Reservation Datum: 01.12.2030 - 03.12.2030                                              |           | Länge:          | mind 80 m.                                            |

Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

AFRY Schweiz AG  
Hauptstrasse 12  
CH - 8043 Zurich  
Tel +41 44 355 55 55  
info@afry.com  
www.afry.ch

| Index | Beschrieb                   |
|-------|-----------------------------|
| A     | Erstausgabe an Auftraggeber |
| B     |                             |
| C     |                             |
| D     |                             |


X:\3-Büro\Hpt\Bü\_Traup\115006710\_3132\_228\_Line\_899\_STW-Ersatz-Mels\_Flums\_Weesen\00\_Phasen\020\_Mobil\03\_Auftragsgut\00\_Plan\_Ausgabe\08.02.02\_Schematische\_Bauphasen\_Flums.dwg



Km 8.6 - 11.9



Km 7.6 - 7.9



Km 6.1



|                                                                                   |                            |                                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Bestehende Anlage / Gleise |  | Betrieb offen                        |
|  | Grundlagedaten / AV        |  | Personenzugang / Bahnbetrieb geschl. |

| Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen |                                              | Ausführung Datum: 01.01.2031 - 29.04.2031 |           | Tiefen       |               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Spermuster                                            | Gleis / Weichen                              | Schichten / Dauer                         | Intervall | FL Ein / aus | Bemerkungen   |
| MF1.1                                                 | 204, 208, FMS: 14, 4, 94, 212 WAL: 13, 24, 4 | So/Mo - Do/Fr 23:00 - 05:25               | 4 Nächte  | ein          | 21, 24        |
| MF1.1                                                 | FMS: 24                                      | So/Mo - Do/Fr 23:00 - 05:25               | 1 Nacht   | aus          | 21, 04<br>1 u |

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

|  | <b>AFRY Schweiz AG</b><br>Hessstrasse 12<br>CH - 8048 Zürich<br>Tel +41 44 385 55 55<br><a href="mailto:info.ch@afry.com">info.ch@afry.com</a><br><a href="http://www.afry.ch">www.afry.ch</a> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Index                                                                               | Beschrieb                                                                                                                                                                                      |
| A                                                                                   | Erstausgabe an Auftraggeber                                                                                                                                                                    |
| B                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| C                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
| D                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |
