

Linie: 890
Bezeichnung: Sargans Ost - Ziegelbrücke
Projektkilometer: 0.900 - 32.900

08.02.03


Kantone: St. Gallen, Glarus
Gemeinden: Mels, Flums, Glarus Nord

Projekt: STW-Ersatz Mels, Flums, Weesen

ISP-Nr.: 1160417

Phase: Auflageprojekt

Übersichtsplan:

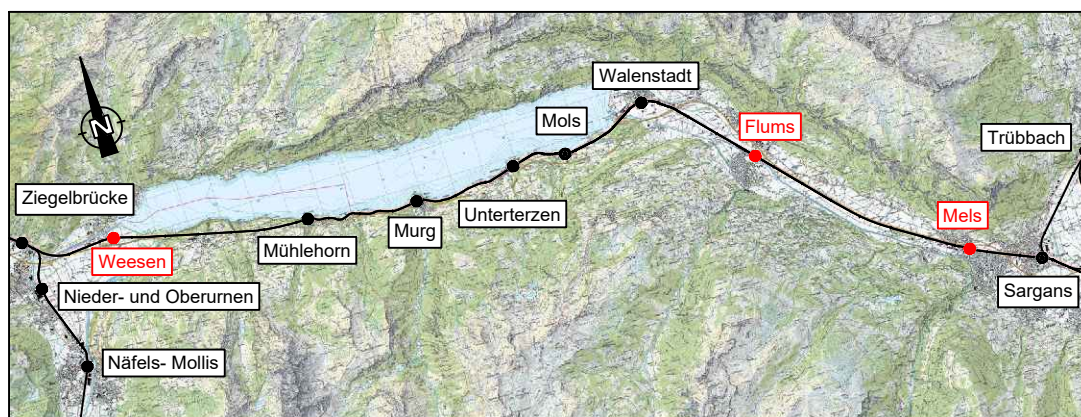

Autoren:

Bauherrenvertretung SBB

Abteilung/OE: I-AEP-PJM-ROT-T6
Name: Andreas Ziegler

Zürich, 27. Juli 2026



Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht
Signiert auf Scribble.com

Projektverfasser

Firma: AFRY Schweiz AG
Name: Carsten Roth

Projektleiter | AFRY Schweiz AG
Stadthausstrasse 14 | CH-8400 Winterthur, 10. Aug. 2026



Qualifizierte elektronische Signatur - Schweizer Recht
Signiert auf Scribble.com



SBB CFF FFS

Weesen Schematische Bauphasen

1:2000

Plan Nr. 08.02.03

Index:	Erstellt:	Vis.	Geprüft:	Vis.	Freigabe:	Vis.
A	31.10.25	sud	31.10.25	wek	31.10.25	roc
B	16.03.26	sud	16.03.26	wek	16.03.26	roc
C						
D						

Filename: 08.02.03 Schematische Bauphasen Weesen

Linie: 890

Km: 28.0 - 33.0


Format: 297/2100

SBB AG, Infrastruktur, Ausbau und Erneuerungsprojekte
Projektmanagement Region Ost, Vulkanplatz 11, 8048 Zürich

Erstellt auf Basisdaten der amtlichen Vermessung und der SBB-Geodaten® swisstopo® Alle Rechte an diesem Dokument stehen der SBB zu.
Für die genaue Lage und die Vollständigkeit der unterirdischen Anlagen besteht keine Gewähr.


Bauphase 0.0 - Weesen, 1:2000

Km 32.7 - 33.0

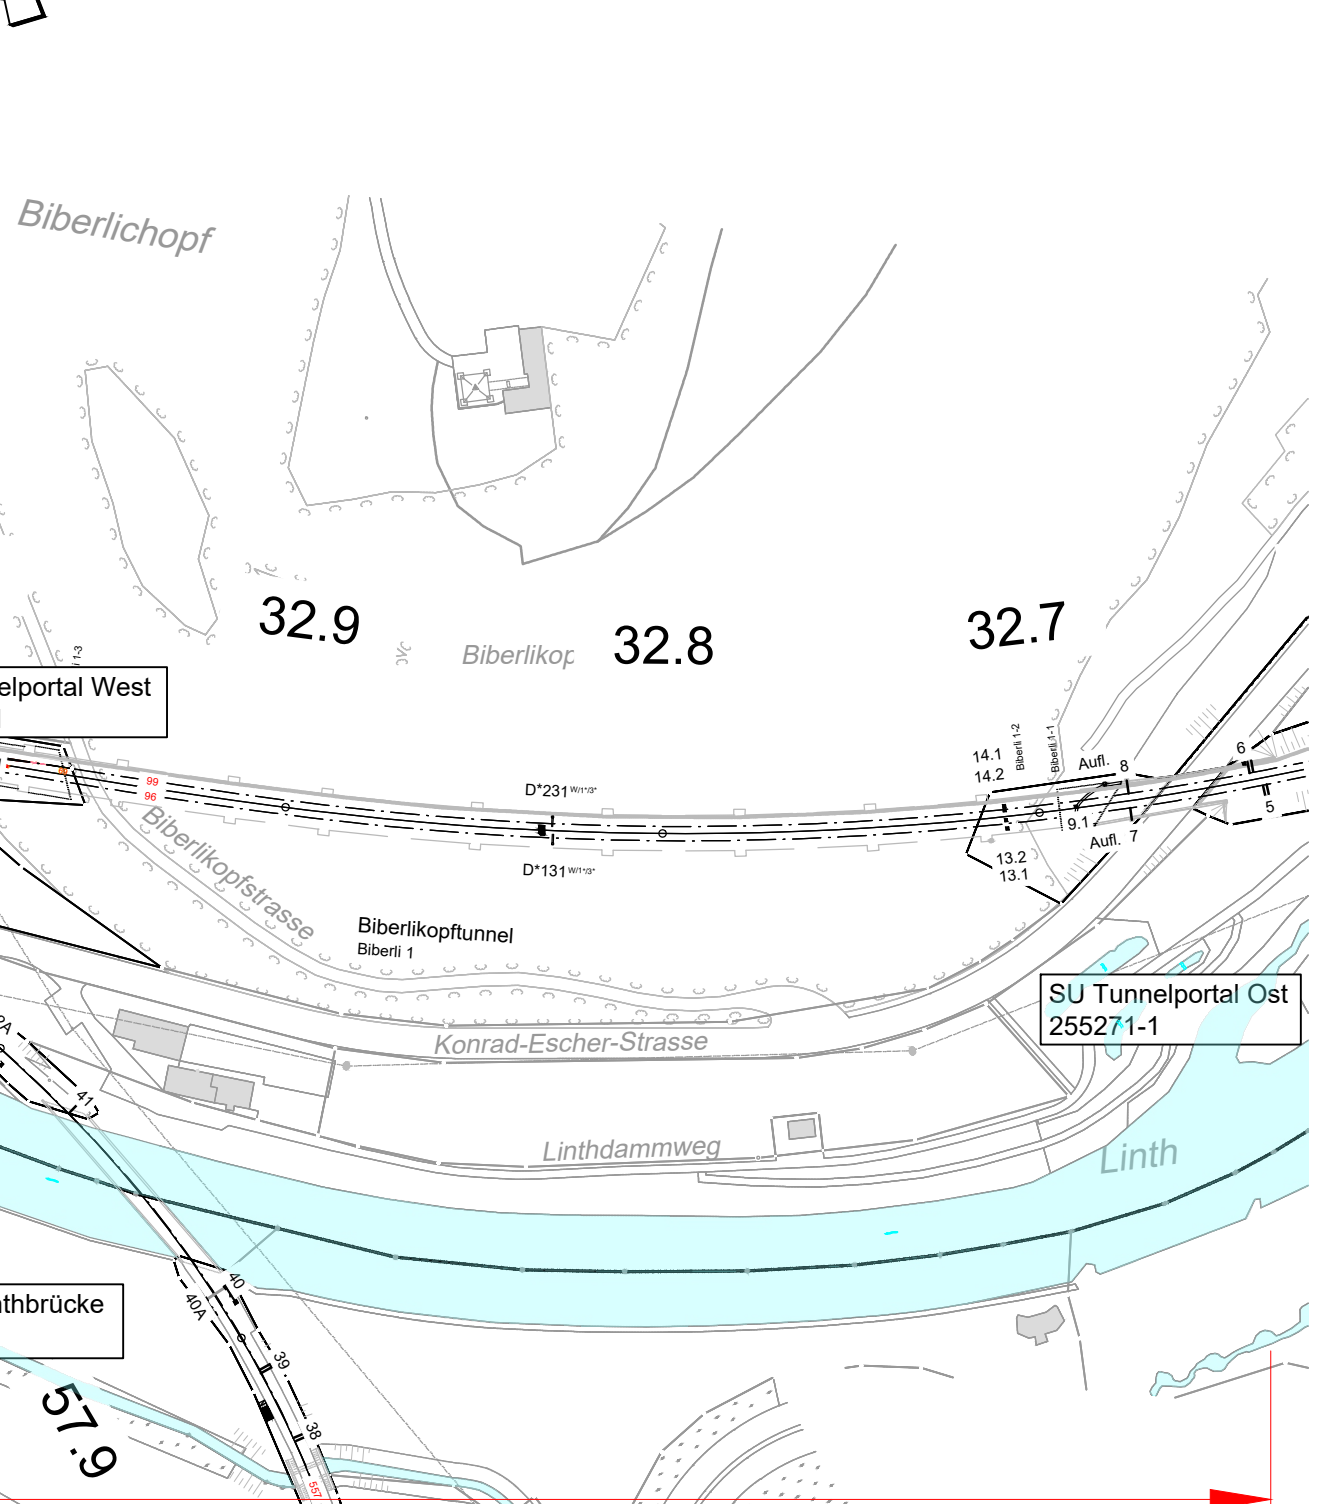

Bauphase 0.0 - Weesen, 1:2000

Km 29.3 - 31.7

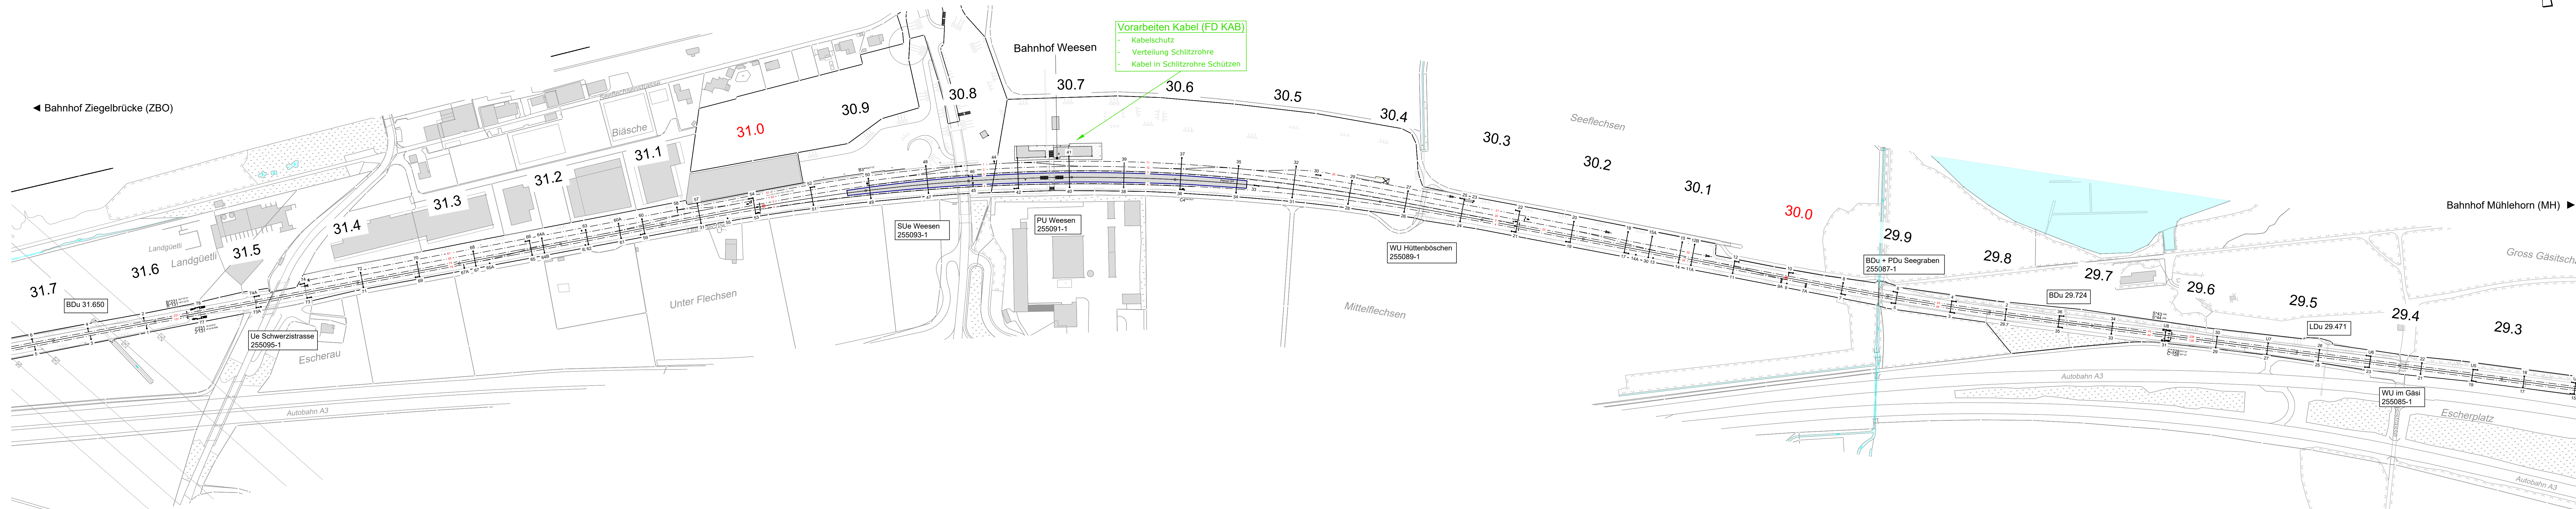

Bauphase 0.0 - Weesen, 1:2000

Km 28.0 - 28.3



Legende

- Bestehende Anlage / Gleise
- Grundlagedaten / AV
- Abbrüche / Gleisabrüche
- Neubauten / Gleisbauten (im Bau)
- Neubauten / neue Gleise erstellt
- Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
- Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
- Drittprojekte
- Betrieb offen
- Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

03.09.2028 - 17.10.2028

Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.




AFRY Schweiz AG
Herstrasse 12
CH - 8048 Zürich
Tel: +41 44 355 55 55
info.ch@afry.com
www.afry.ch


Index	Beschrieb
A	Erstausgabe an Auftraggeber
B	
C	
D	

X:\3-8\CH\proj\BU_Transp\115008710_3132_SBB_Linie_800_STW-Ernetz-Mehr_Flans_Weesen\300_Process\320_Models\33_Aufgabenplan\00_Plan_Ausgabe\08.02.03_Schematische_Bauphasen_Weesen.dwg

Bauphase 1.0 - Weesen, 1:2000
Km 32.7 - 33.0

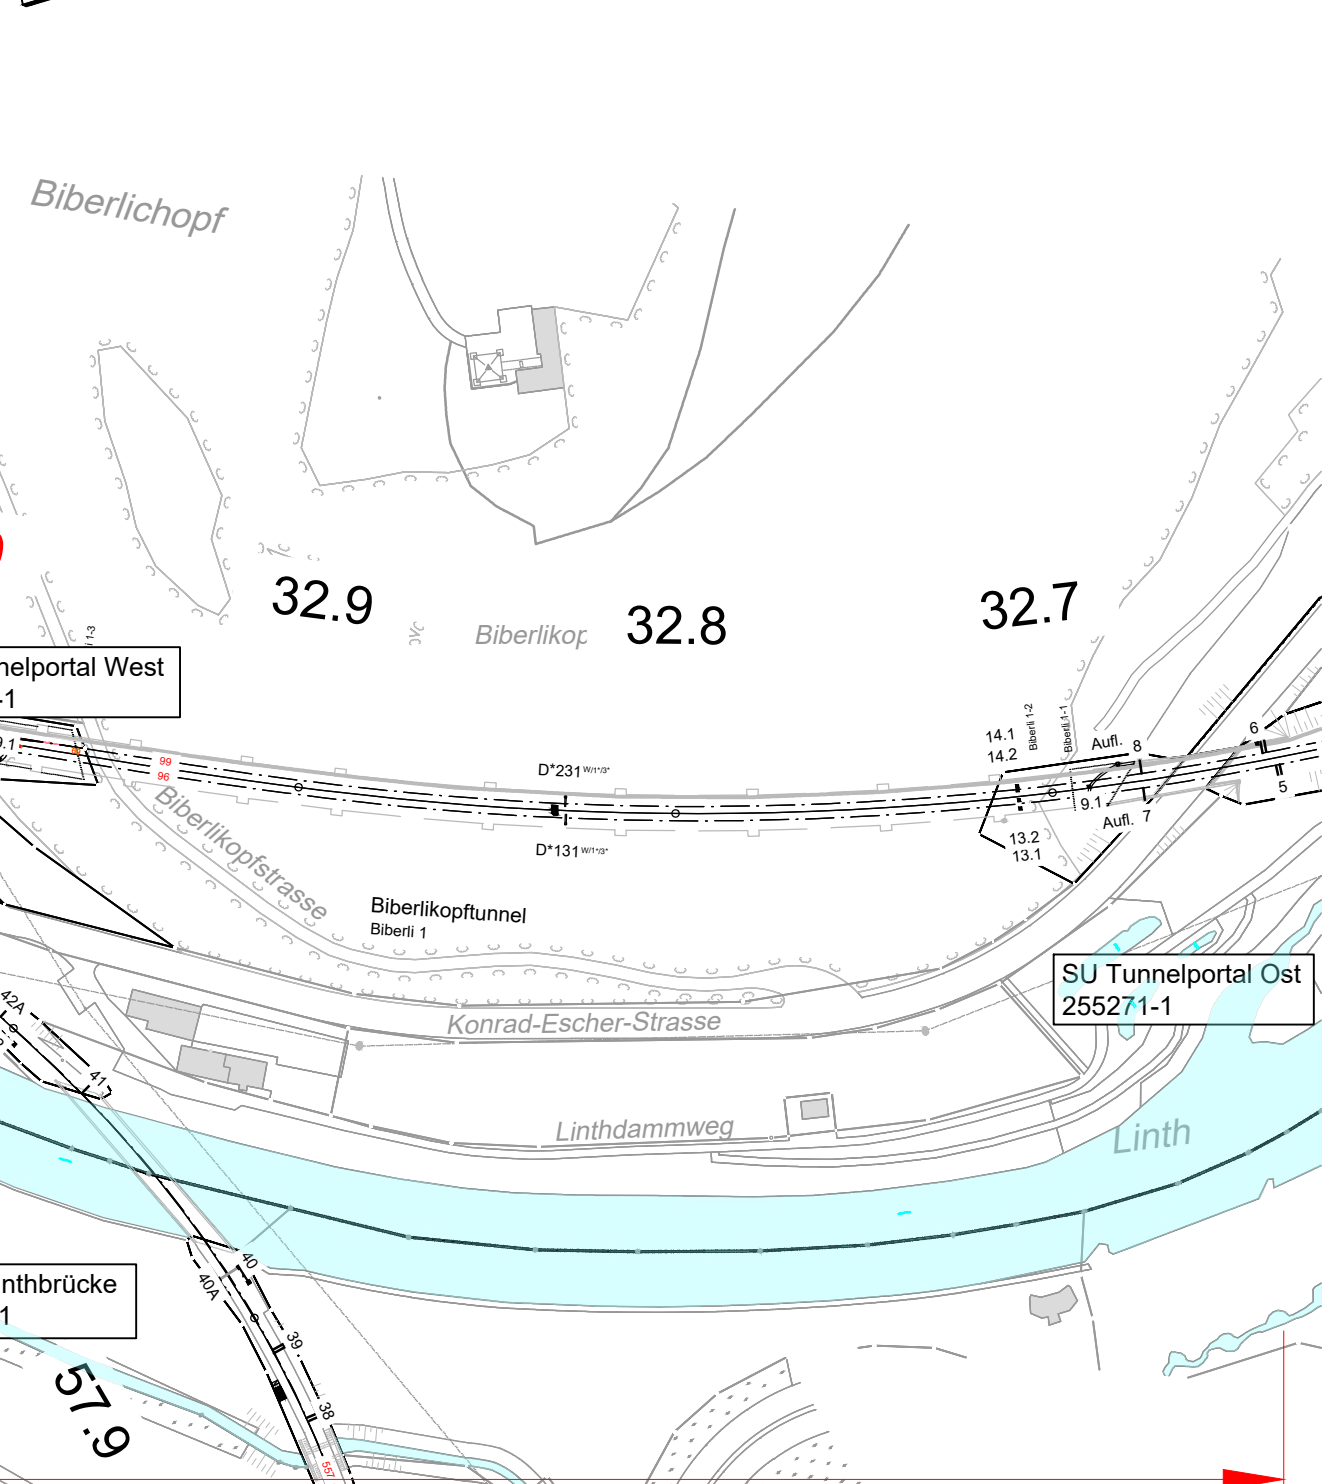

Bauphase 1.0 - Weesen, 1:2000
Km 29.3 - 31.7

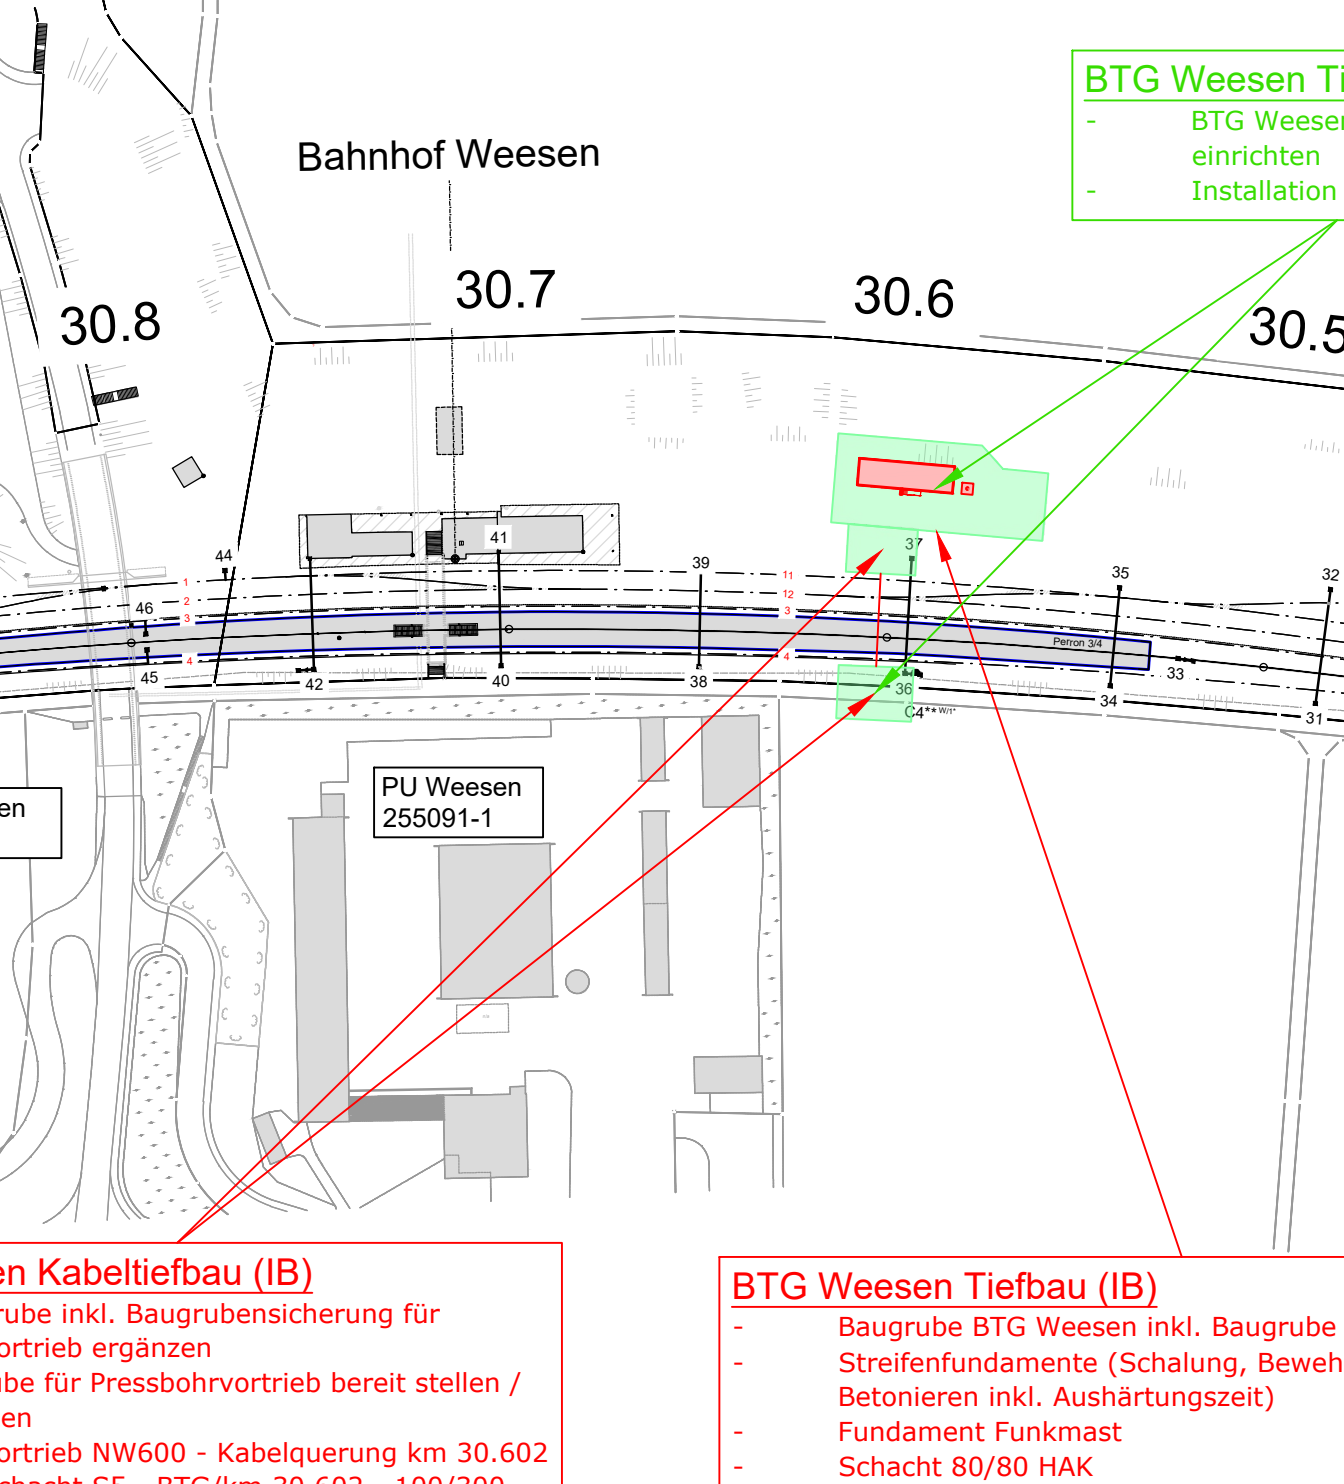

Bauphase 1.0 - Weesen, 1:2000
Km 28.0 - 28.3



Legende

- Bestehende Anlage / Gleise
- Grundlagedaten / AV
- Abbrüche / Gleisabrüche
- Neubauten / Gleisbauten (im Bau)
- Neubauten / neue Gleise erstellt
- Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
- Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
- Drittprojekte
- Betrieb offen
- Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen


08.05.2029 - 13.07.2029

Bemerkungen


Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

 AFRY Schweiz AG Heroldstrasse 12 CH - 8048 Zürich Tel +41 44 355 55 55 info.ch@afry.com www.afry.ch	
Index	Beschrieb
A	Erstausgabe an Auftraggeber
B	
C	
D	


Bauphase 2.1 - Weesen, 1:2000
Km 32.7 - 33.0

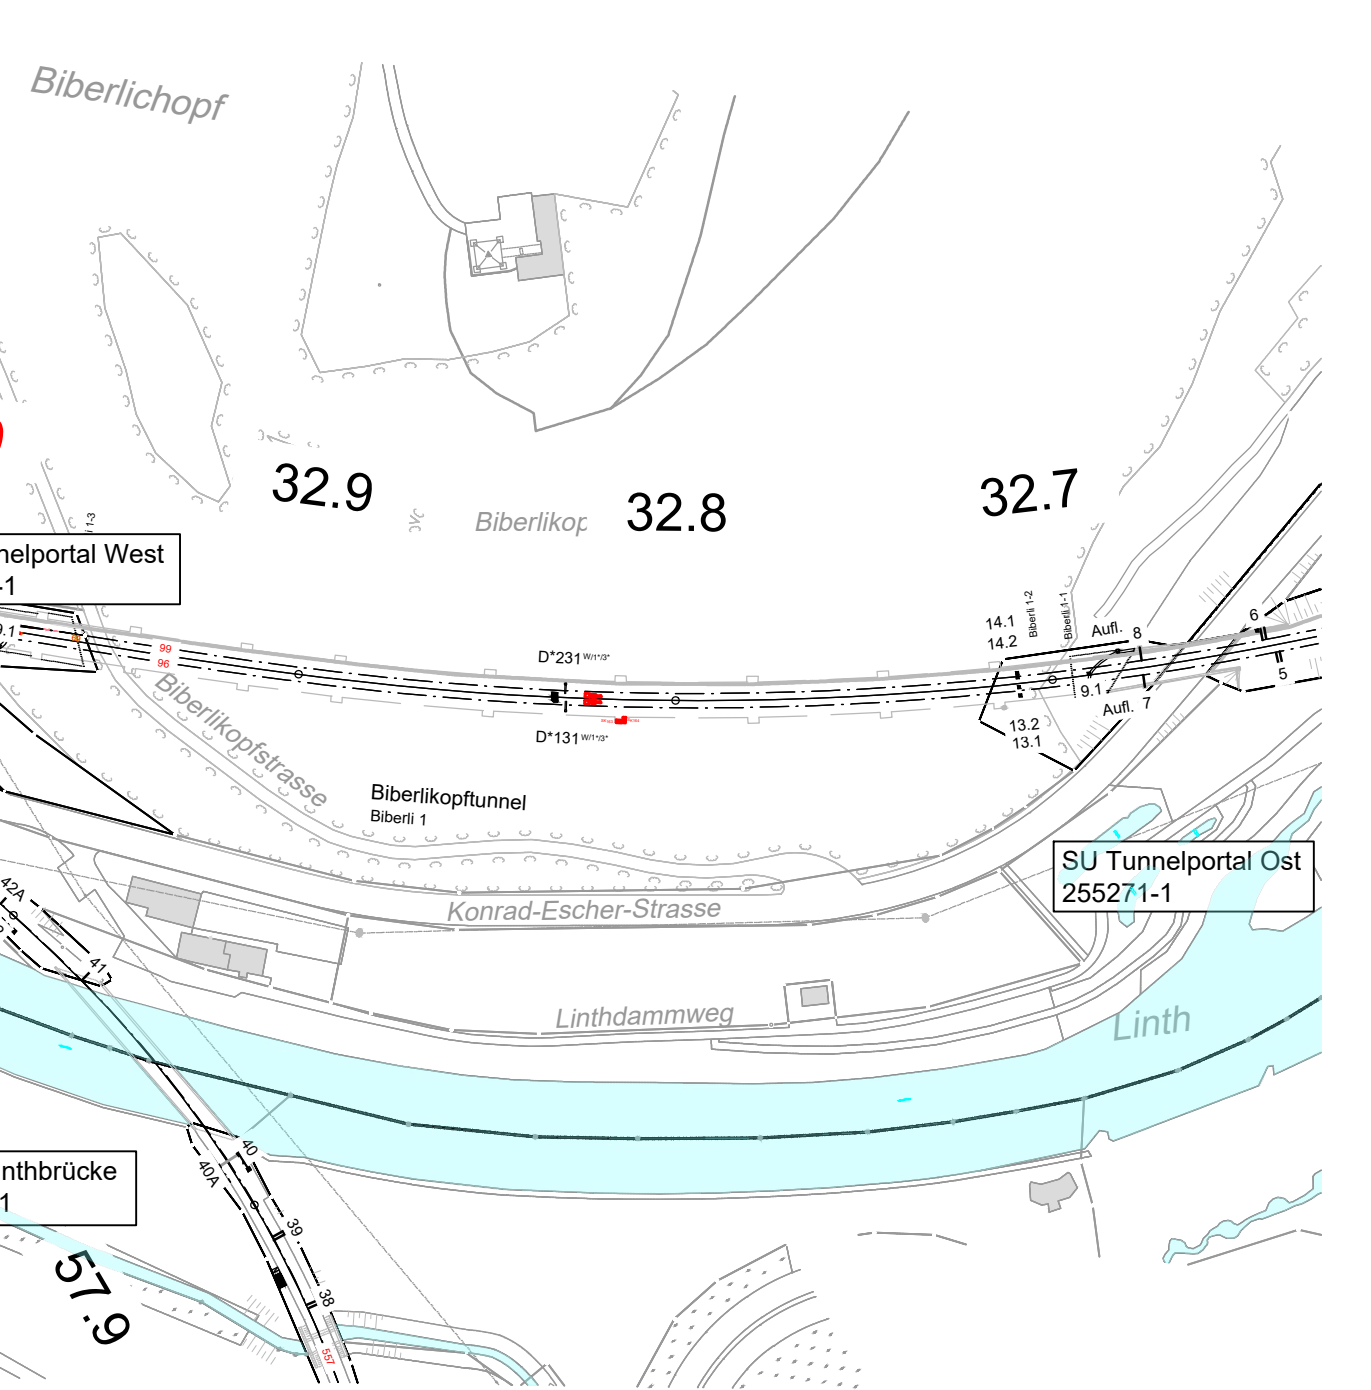

Bauphase 2.1 - Weesen, 1:2000
Km 29.3 - 31.7

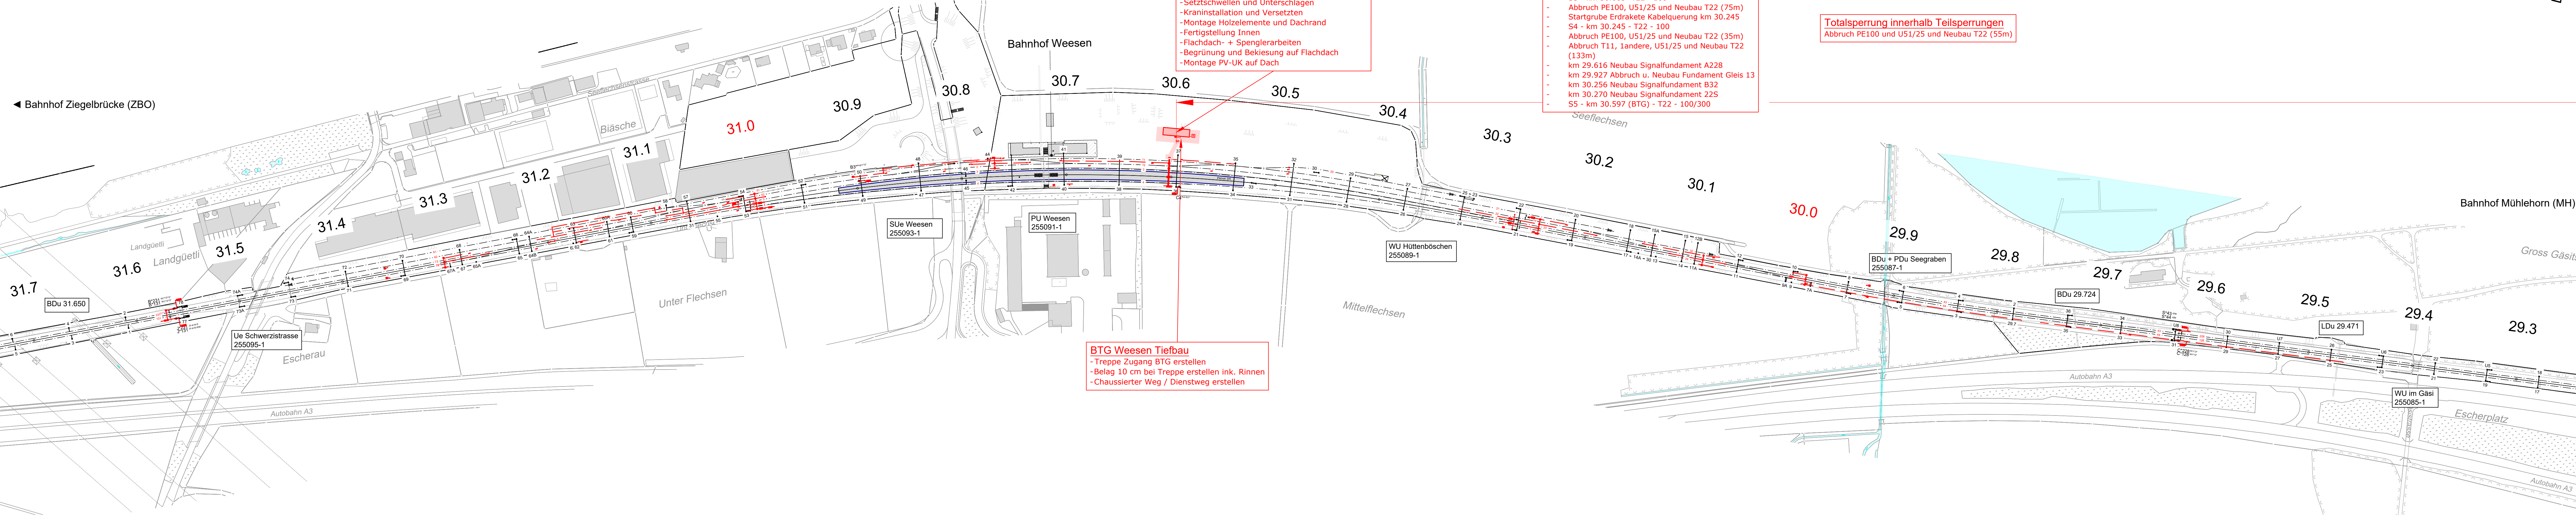

Bauphase 2.1 - Weesen, 1:2000
Km 28.0 - 28.3

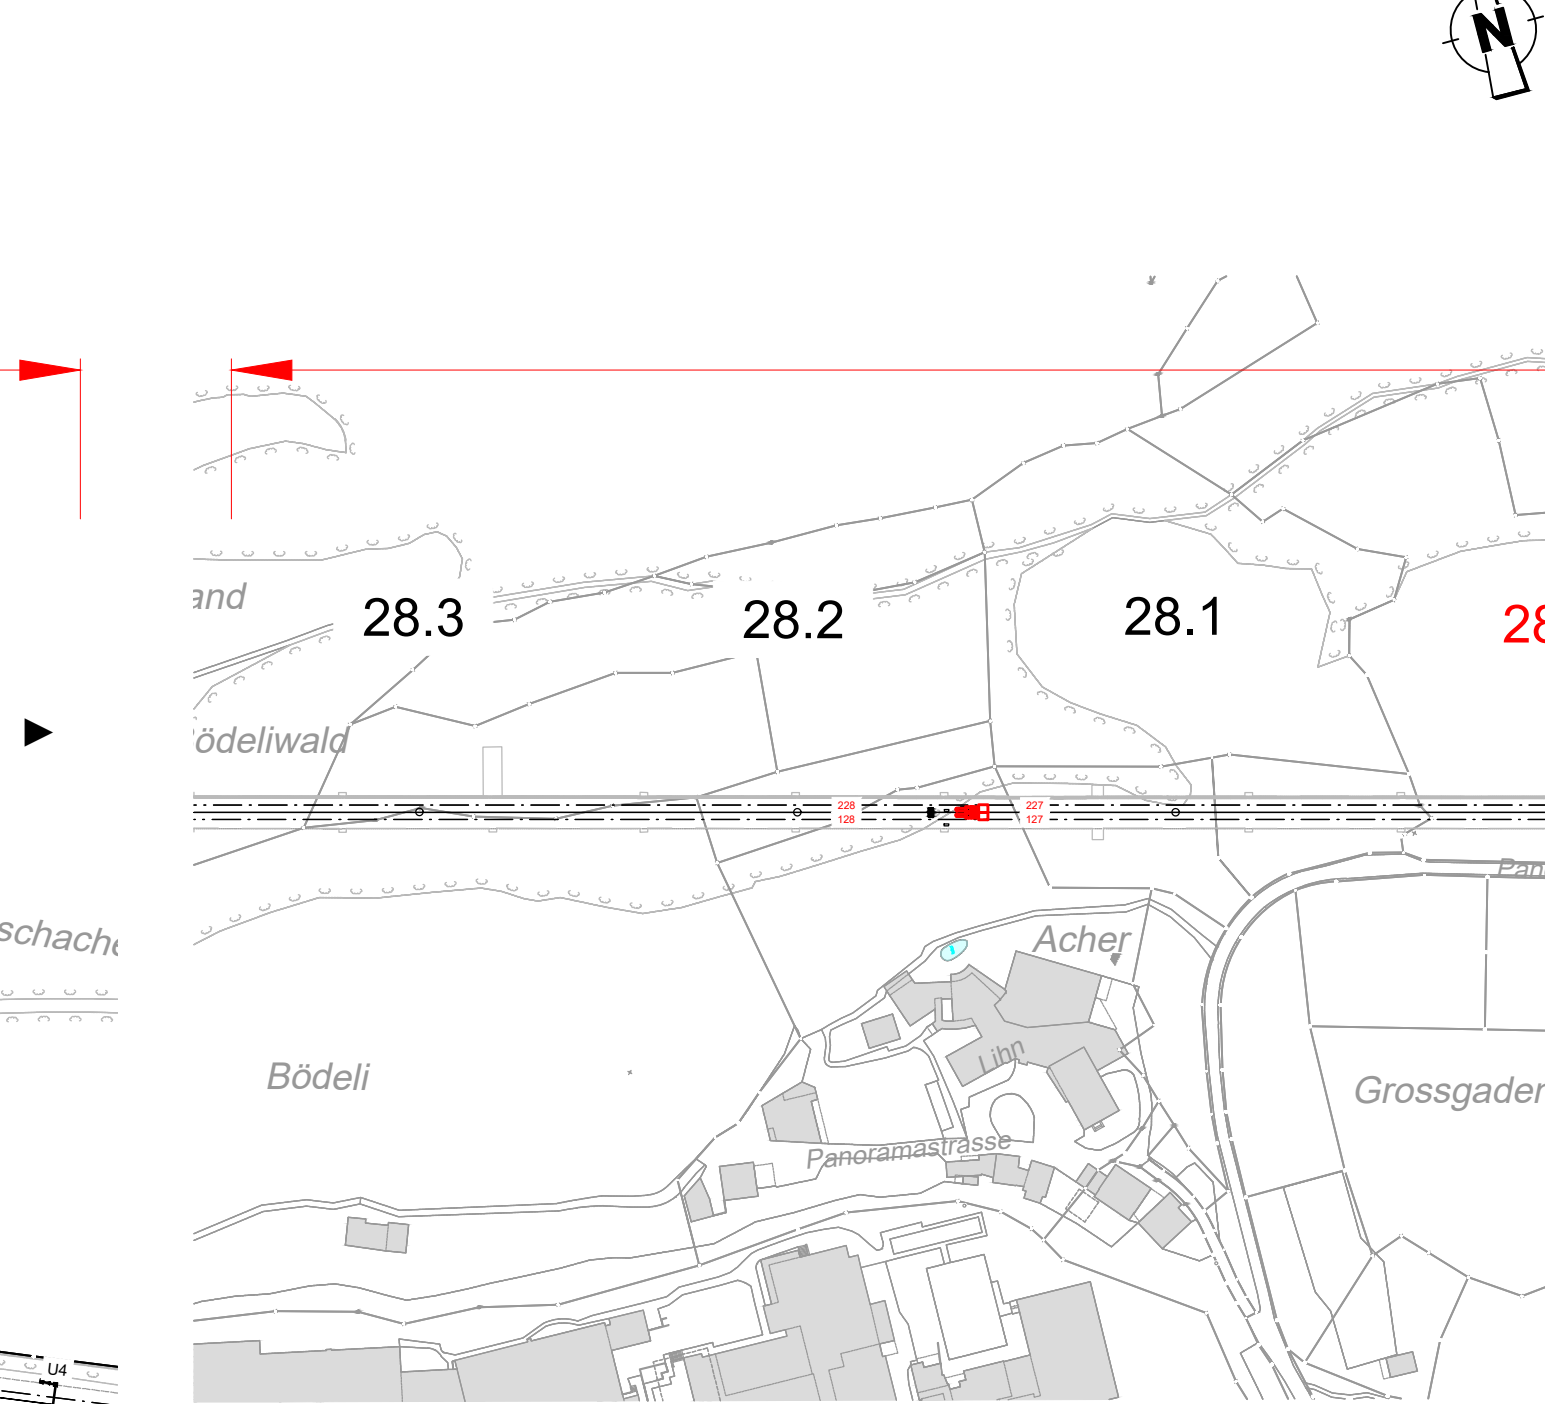

Legende

- Bestehende Anlage / Gleise
- Grundlagedaten / AV
- Abbrüche / Gleisabrüche
- Neubauten / Gleisbauten (im Bau)
- Neubauten / neue Gleise erstellt
- Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
- Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
- Drittprojekte
- Betrieb offen
- Personeinzugang / Bahnbetrieb geschlossen

04.06.2029 - 02.07.2029

Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Fiums und Weesen		Ausführung Datum: 04.06.2029 - 02.07.2029			Tiefbauarbeiten
Sperrmuster	Gleis / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / Aus	Bemerkungen, MIZ
W1.1	231 - WN GI 3 - 228 - 226, WN GI 1, WN GI 2	täglich 22:05 - 05:20 Uhr	24 Nächte	aus	
W3.1					
W3.2					
Logistikgleis	Gleis 21/11 (Bahnhof Weesen)	Reservation Datum: 01.06.2029 - 30.10.2029	Länge:	km 30.2 bis km 30.4	

Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.




AFRY Schweiz AG
Herostrasse 12
CH - 8048 Zürich
Tel: +41 44 355 55 55
info.ch@afry.com
www.afry.ch

Index	Beschrieb
A	Erstausgabe an Auftraggeber
B	
C	
D	

X:\3-8\U\CH\BU_Trasse\115008710_3132_SBB_Linie_800_STW-Ersatz Mels_Fiums_Weesen\300_Process\320_Models\33_Auftraggeber\00_Plan_Ausgabe\06.02.03_Schematische_Bauphasen_Weesen.dwg


Km 32.7 - 33.0

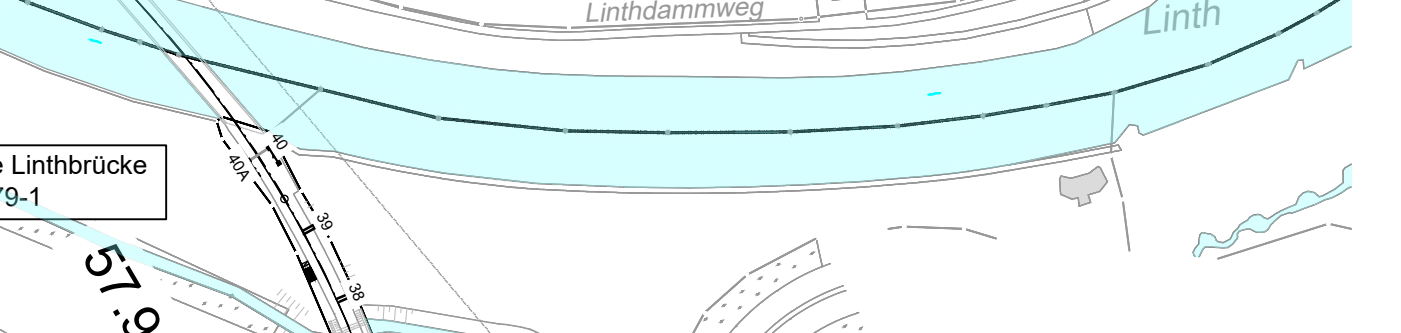

n 29.3 - 31.7



Km 28.0 - 28

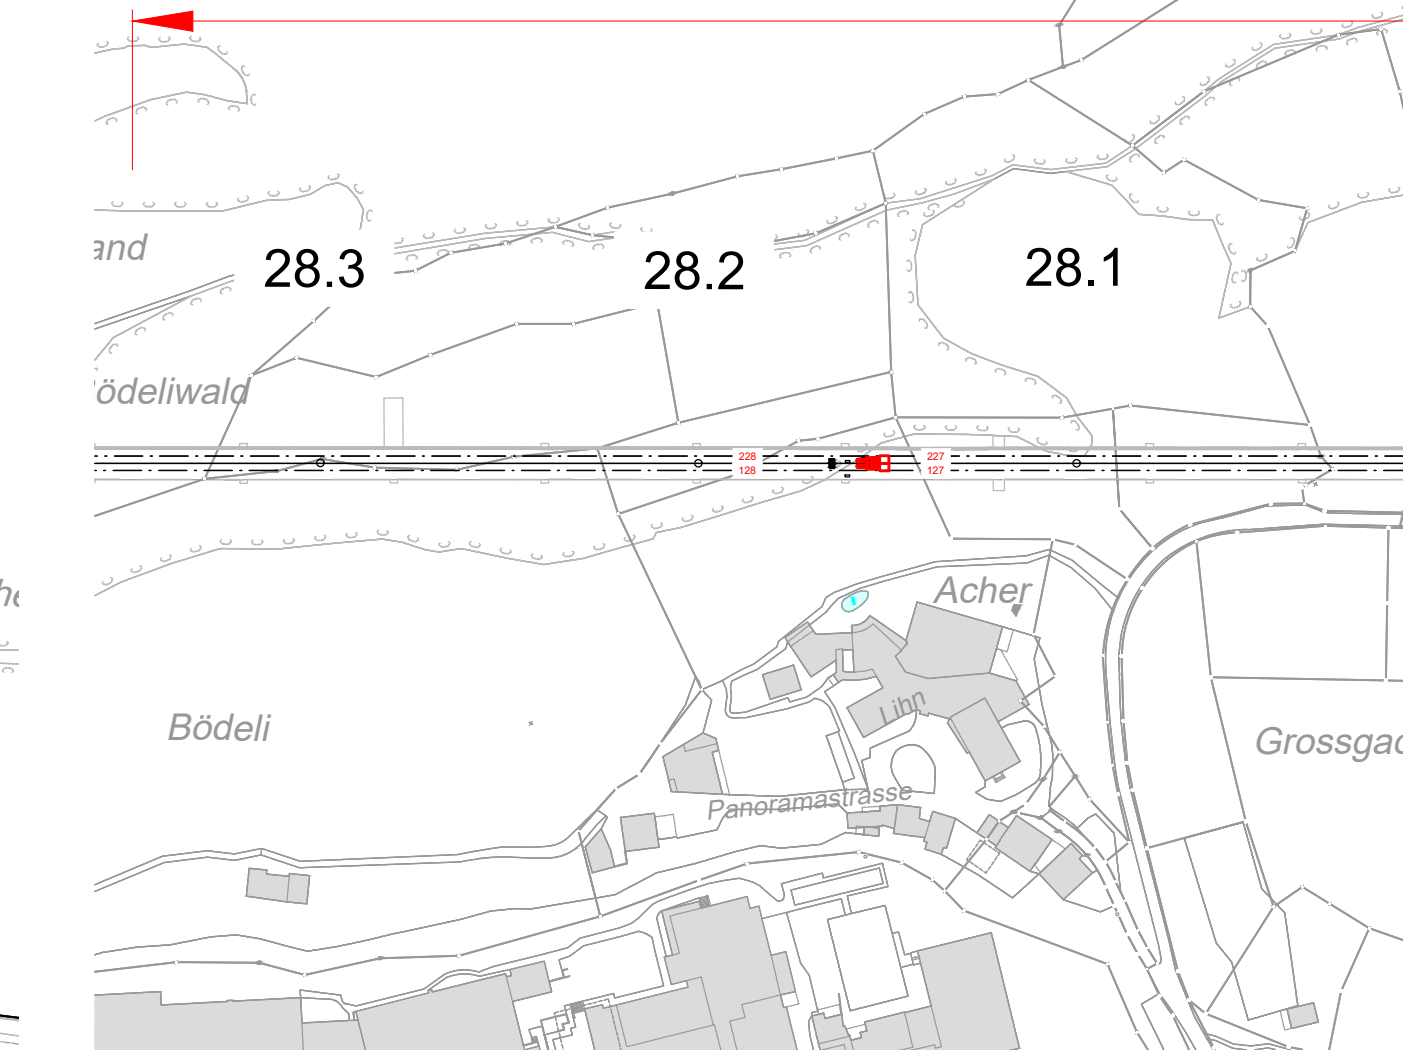

	Bestehende Anlage / Gleise		Betrieb offen
	Grundlagedaten / AV		Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  | Abbrüche / Gleisabbrüche |
|  | Neubauten / Gleisbauten (im Bau) |
|  | Neubauten / neue Gleise erstellt |
|  | Provisorien / prov. Gleise (im Bau) |
|  | Provisorien / prov. Gleise (erstellt) |
|  | Drittprojekte |

03.07.2029 - 23.07.2029

	Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen	Ausführung Datum: 03.07.2029 - 23.07.2029			Tiefbaubearbeitung
Spermusterr	Gleis / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / Aus	Bemerkungen,
W2.1	126 – 128 – WN Gl 4 – 131	Täglich 22:05 – 05:20 Uhr	18 Nächte	aus	
W3.1	231 – WN Gl 3 – 228 – 226, 126 – 128 – WN Gl 4 – 131, WN Gl 1, WN Gl 2	Nacht Sa/So 01:10 – 04:40 Uhr Nacht So/Mo 01:10 – 03:20 / 03:40 – 04:40 Uhr Nächte Mo/Di – Fr/Sa 01:40 – 02:40 / 03:40 – 04:40 Uhr	10 Nächte	aus Sa/So	Langsamfahrstrasse v _{max} =80 km/h (13.07.2029 - 25.07.2029)
W3.2	228 - 42 - 4 - 23- 32 - 13 - 3	So/Mo - Do/Fr 01:10 - 04:30	2 Nächte	aus	
Logistikgleis	Gleis 21/11 (Bahnhof Weesen)	Reservation Datum: 01.06.2029 - 30.10.2029		Länge:	km 30,2 bis km


Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

 AFRY	AFRY Schweiz AG Herstrasse 12 CH - 8048 Zürich Tel +41 44 355 55 55 info.ch@afry.com www.afry.ch
Index	Beschrieb
A	Erstausgabe an Auftraggeber
B	
C	
D	


Bauphase 3.1 - Weesen, 1:2000

Km 32.7 - 33.0

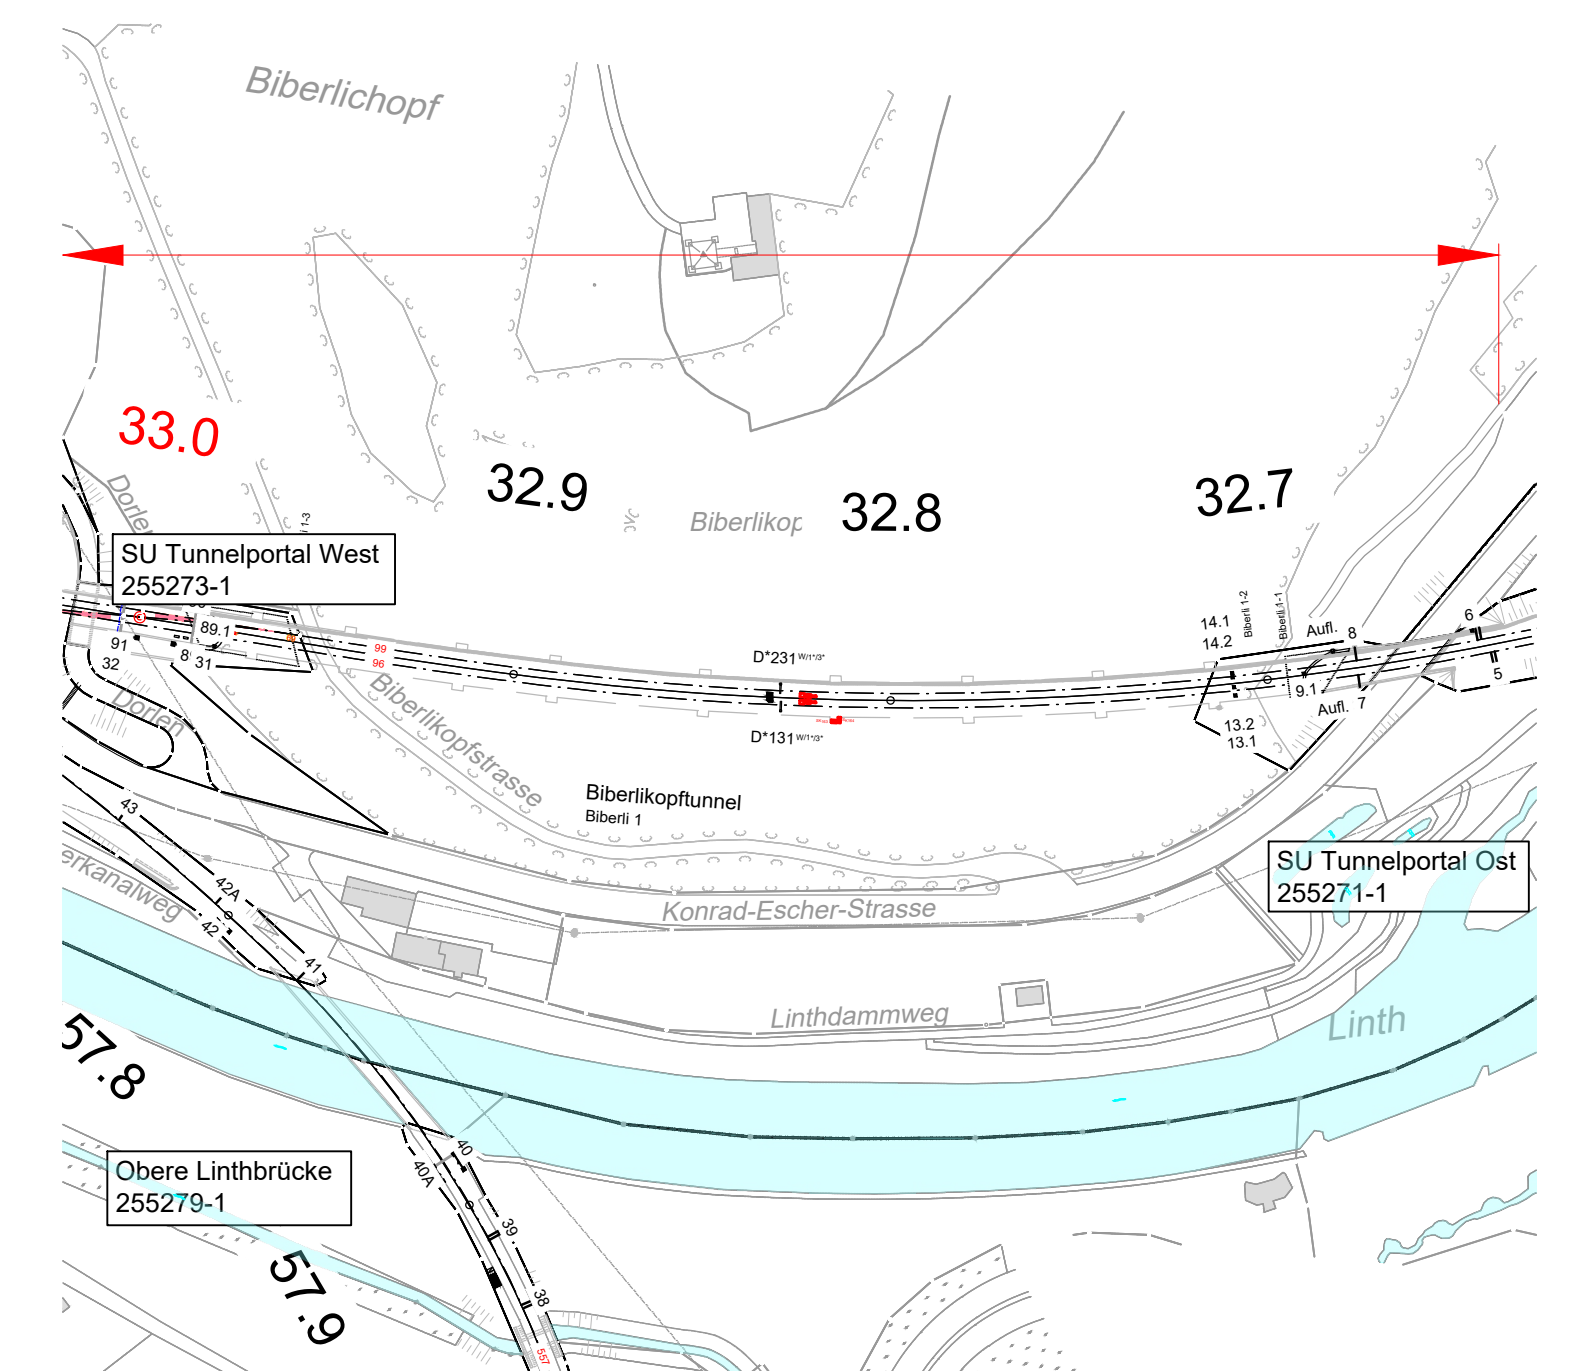

Bauphase 3.1 - Weesen, 1:2000

Km 29.3 - 31.7

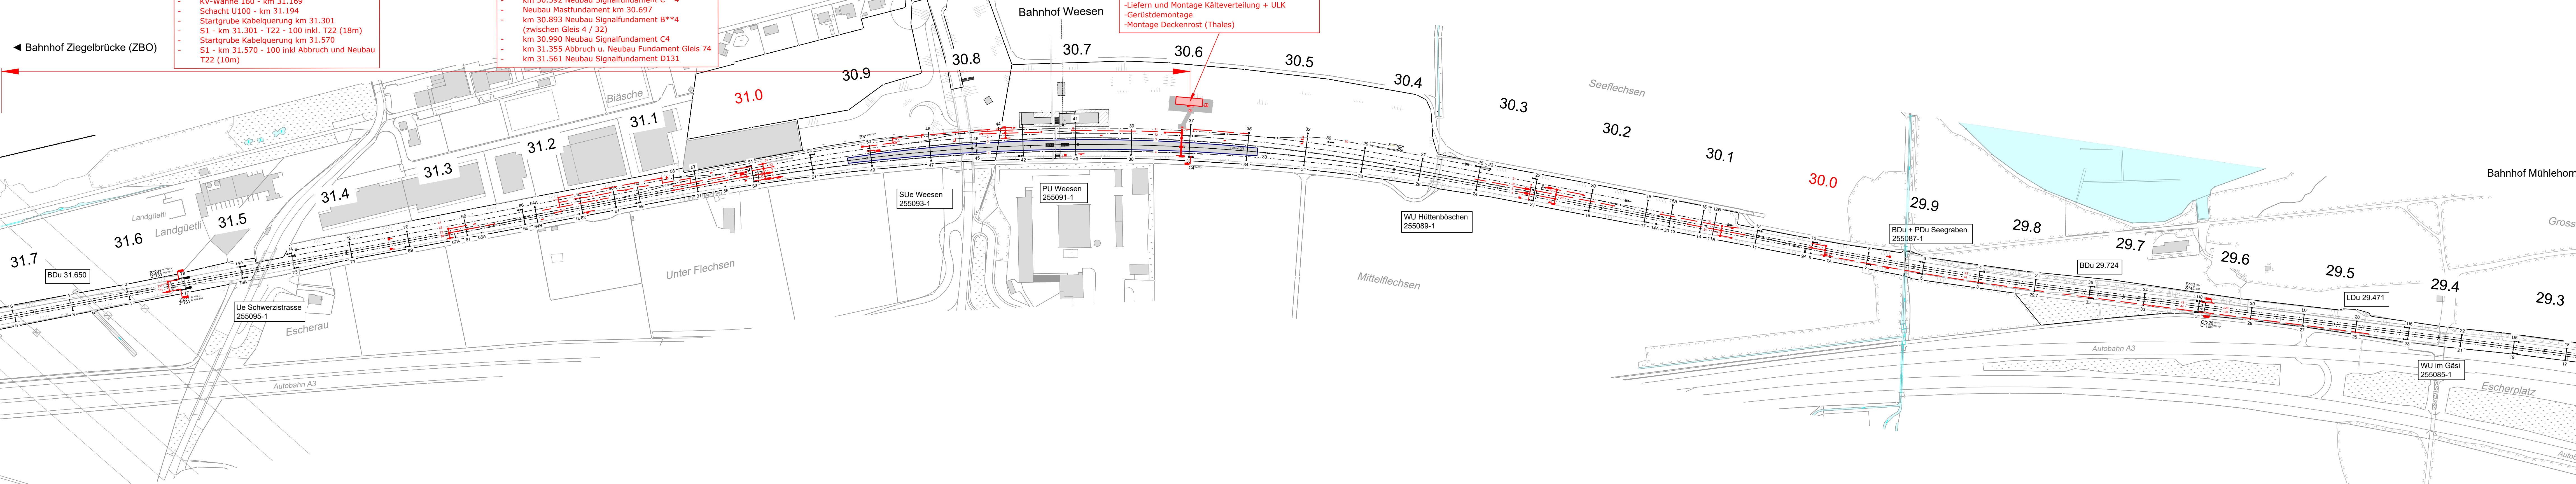

Bauphase 3.1 - Weesen, 1:2000

Km 28.0 - 28.3



Legende

- Bestehende Anlage / Gleise
- Grundlagedaten / AV
- Abbrüche / Gleisabbrüche
- Neubauten / Gleisbauten (im Bau)
- Neubauten / neue Gleise erstellt
- Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
- Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
- Drittprojekte
- Betrieb offen
- Personeinzugang / Bahnbetrieb geschlossen

23.07.2029 - 15.08.2029

Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen		Ausführung Datum: 23.07.2029 - 15.08.2029		Tiefbauarbeiten	
Sperrmuster	Gleis / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / Aus	Bemerkungen, MIZ
W1.1	231 - WN GI 3 - 228 - 226, WN GI 1, WN GI 2	täglich 22:05 - 05:20 Uhr	21 Nächte	aus	
W3.1	231 - WN GI 3 - 228 - 226, 126 - 128 - WN GI 4 - 131, WN GI 1, WN GI 2	Nacht Sa/So 01:10 - 04:40 Uhr Nacht So/Mo 01:10 - 03:20 / 03:40 - 04:40 Uhr Nacht Mo/Di - Fr/Sa 01:40 - 02:40 / 03:40 - 04:40 Uhr	8 Nächte	aus Sa/So	Langsamfahrstelle: v _{max} =80 km/h (03.08.2029 - 16.08.2029)
W3.2	231 - WN GI 3 - 228 - 226, 126 - 128 - WN GI 4 - 131, WN GI 1, WN GI 2	So/Mo - Do/Fr 01:10 - 04:30	2 Nächte	aus	
Logistikgleis	Gleis 21/11 (Bahnhof Weesen)	Reservation Datum: 01.08.2029 - 30.10.2029	Länge:	km 30.2 bis km 30.4	

Bemerkungen


Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

AFRY Schweiz AG
Herstrasse 12
CH - 8048 Zürich
Tel: +41 44 355 55 55
info.ch@afry.com
www.afry.ch

Index	Beschrieb
A	Erstausgabe an Auftraggeber
B	
C	
D	

X:\3-8\U\CH\BU_Transp\115008710_3132_SBB_Linie_800_STW-Ersatz Mels_Flums_Weesen\300_Process\320_Models\33_Auftraggeber\000_Plan_Ausgabe\08.02.03_Schematische_Bauphasen_Weesen.dwg

Km 32.7 - 33.0



ne Sperrung
T2 (106m) inkl. BR60/80 - km 30.857
R60/80 - km 30.875 inkl. T22 (29m) und
K101 U100/142
abelquerung km 31.570 (Erdrakete)
tartgrube Pressbohrvortrieb km 30.997,
W400
ressbohrvortrieb km 30.997, NW400
4 - km 30.997 - T22 - 100 inkl. 1PE100 (24m)

Sperrung innerhalb Teilspernung

Erdrückung

- au T22 (102m)
- ube Erdrückte Kabelquerung km 31.301
- km 31.301 - T22 - 100
- querung km 31.301 erstellen (Erdrückte)
- ube Kabelquerung km 31.570
- km 31.570 - T22 - 100 inkl Abbruch T13 und
- au T22 (16m)
- querung km 30.768 erstellen in offener
- eise
- km 30.768 - T22 - 100 inkl. KV10 U51/25
- km 30.768 - T22 - 100 inkl. PE100 (53m)
- U51/25 Perronbereich
- km 30.768 - T22 - 100 inkl T17 (9m)

Teilspernung

- Kabelquerung km 30.873 erstellen in offener Bauweise
- Brunnenring BR60/80 inkl T22 (29m)
- Brunnenring BR60/80
- S3 - km 30.997 - T22 - 100
- S2 - km 30.997 - T22 - 100
- Neubau T22 (96m)
- Kabelquerung km 31.068 / 31.094 erstellen in offener Bauweise
- S1 - km 31.068 - T22 - BR60/80
- S2 - km 31.068 - T22 - BR60/80
- 1PE100 (61m)
- S1 - km 31.094 - T22 - BR60/80
- S2 - km 31.068 - T22 - BR60/80
- Abbrüche 1Pe100, U51/25 Neubau T22 (65m)

Km 29.3 - 31.7

Sperrung

80.990 Neubau Signalfundament C3

81.355 Abbruch u. Neubau Fundament zwischen
s 972/73

81.561 Neubau Signalfundament D231

km 29.3 - 31.7



Wesen: Roh- und Ausbau Premoco
Installationen
Entnahme SBB BTG Weesen<--> PSA

Km 28.0 - 28.3




	Bestehende Anlage / Gleise		Betrieb offen
	Grundlagedaten / AV		Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen		Ausführung Datum: 15.08.2029 - 04.10.2029			Tiefenbauarbeiten
Spermuster	Gleis / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / Aus	Bemerkungen
W2.1	126 – 128 – WN Gl 4 – 131	Täglich 22:05 – 05:20 Uhr	44 Nächte	aus	
W3.1	231 – WN Gl 3 – 228 – 226, 126 – 128 – WN Gl 4 – 131, WN Gl 1, WN Gl 2	Nacht Sa/So 01:10 – 04:40 Uhr Nacht Mo/Di 01:10 – 03:20 / 03:40 – 04:40 Uhr Nächte Mo/Di – Fr/Sa 01:40 – 02:40 / 03:40 – 04:40 Uhr	13 Nächte	aus Sa/So	Langsamfahrt vmax=40 (31.08.2029 18.09.2029)
W3.2	231 – WN Gl 3 – 228 – 226, 126 – 128 – WN Gl 4 – 131, WN Gl 1, WN Gl 2	So/Mo - Do/Fr 01:10 - 04:30	3 Nächte	aus	
Logistikgleis	Gleis 21/11 (Bahnhof Weesen)	Reservation Datum: 01.08.2029 - 30.10.2029		Länge:	km 30.2 bis km 30.8


Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

 AFRY		AFRY Schweiz AG Heristrasse 12 CH - 8048 Zürich Tel +41 44 365 55 55 info.ch@afry.com www.afry.ch
Index	Beschrieb	
A	Erstausgabe an Auftraggeber	
B		
C		
D		
X:\SRI\CH\076\IBI\Transent\15100710_5119_SGR_Lise_890_STW\Export\Map_Flans_Wassent\300_Process\320_Models\33_Aufbauelemente\000_Plan		

Km 32.7 - 33.0

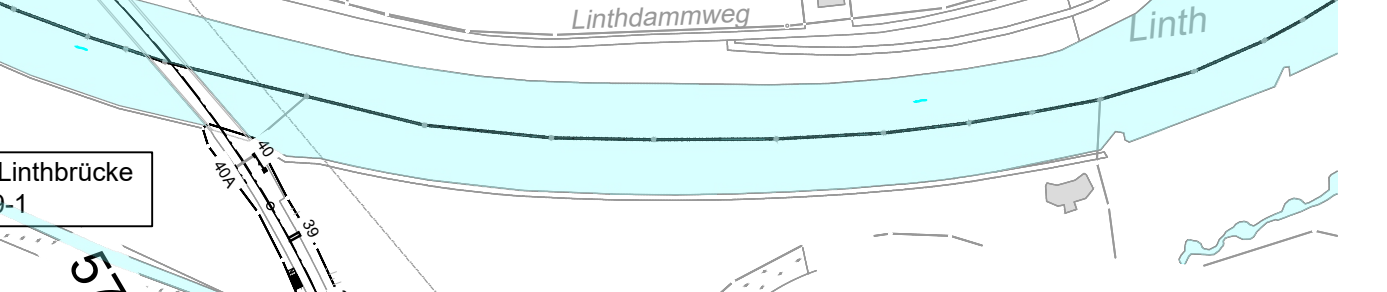

m 29.3 - 31.7

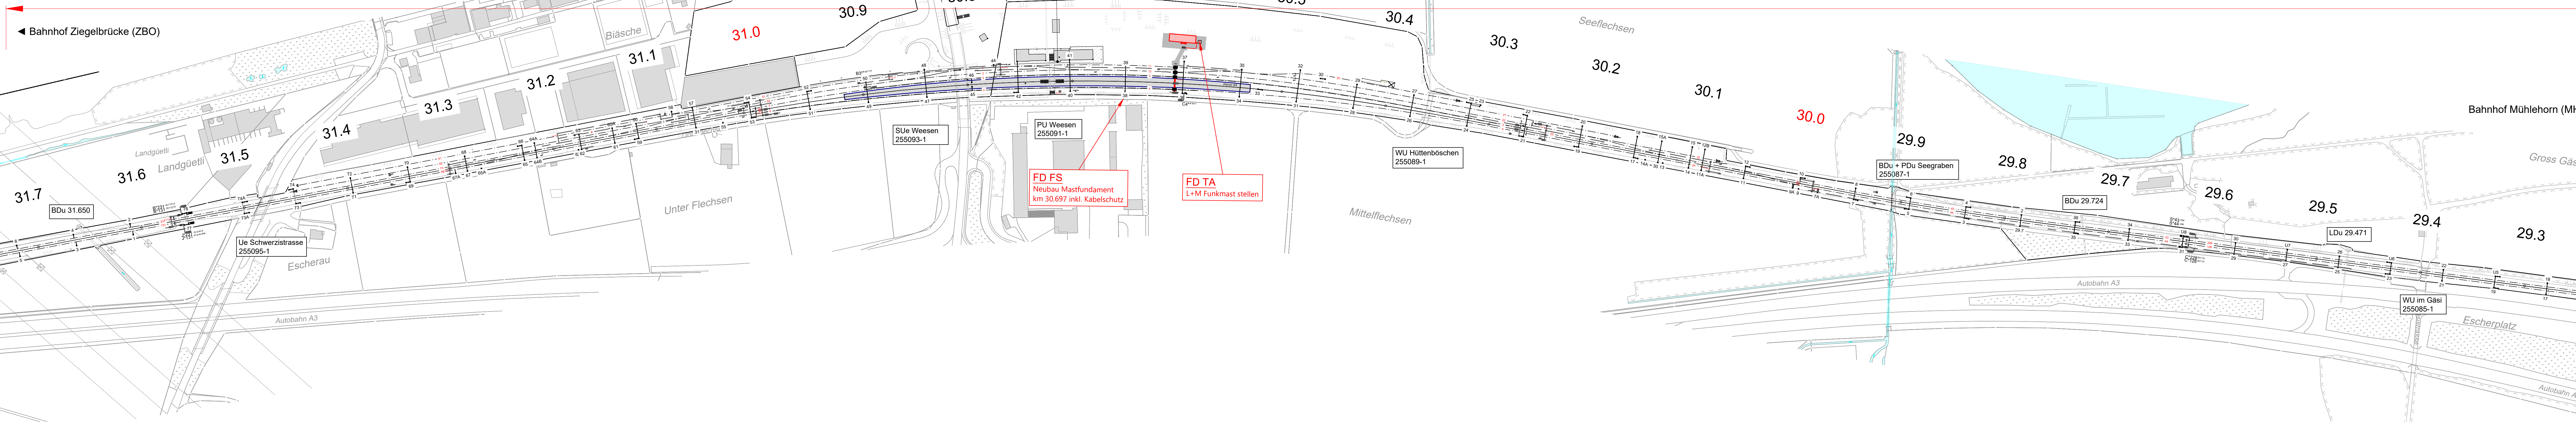

Km 28.0 - 28.5




☐ Bestehende Anlage / Gleise
 ☒ Betrieb offen
 ☐ Grundlagedaten / AV
 ☒ Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

 Neubauten / Gleisbauten (im Bau)
 Neubauten / neue Gleise erstellt
 Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
 Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
 Drittprojekte

05.09.2029 - 26.10.2029

Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen		Ausführung Datum: 05.09.2029 - 26.10.2029		Tiefbau	
Sperrmuster	Gleis / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / Aus	Bemerkung
W1.1	126, 127, 128 WN: 44, 4, 74, 131	Täglich 22:05 – 05:20 Uhr	2 Nächte		12.09 14.09
W3.1	WN: 4	Täglich 22:05 – 05:20 Uhr	9 Nächte	ein	14.09.29 24.09.29 08.10.29 11.10.29
W3.2	WN: 4, 74, 131, 96, ZB: 81, 84, 73, 1	Täglich 22:05 – 05:20 Uhr	2 Nächte	ein	05.10. 08.10.
Logistikgleis	Gleis 21/11 (Bahnhof Weesen)	Reservation Datum: 01.06.2029 - 30.10.2029		Länge:	km 30,2


Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RaiSys.

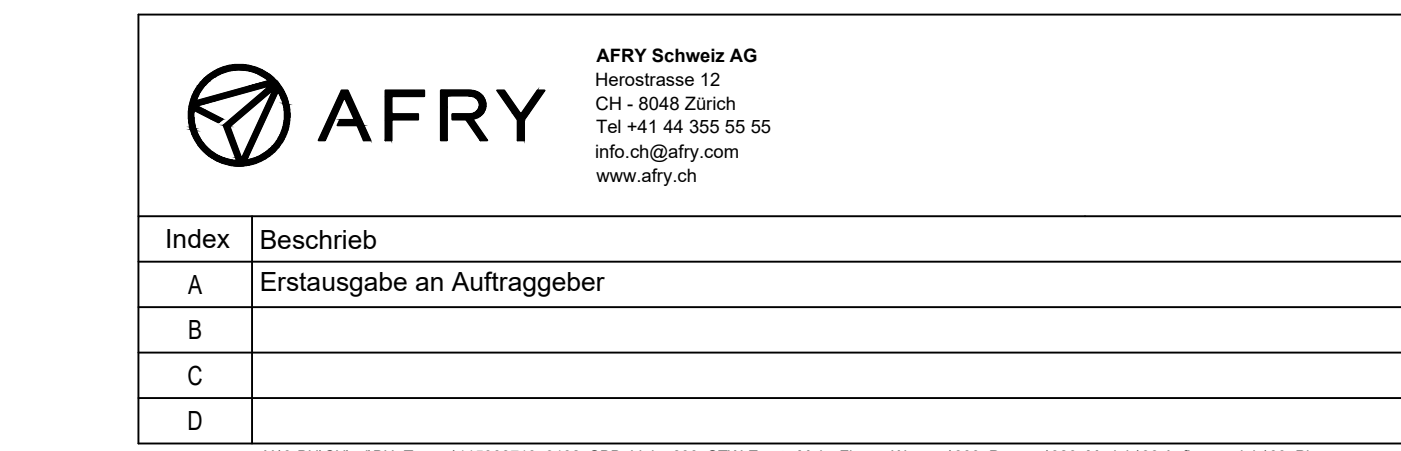

Km 32.7 - 33.0



m 29.3 - 31.7



Erstellen Muffenschächte Strecke (FD KAB) -Deponieren Material -Abbruch Kanal -Neubau Muffenschacht

age 50 kVA Trafo inkl. Sicherungskasten und neuer Mast 38A
 uch 11 Hochlampen auf FL Tragwerken inkl. Kabel bis OK Kabelve
 uch 1 Beleuchtungskandelaber auf Mittelperron / kein Intervallbee
 tzen Leuchte am Joch 26/27
 au neue FS Steuerung in neuem BTG
 ttelbar vor IBN neues BTG Anschluss neuer Trafo an Fahrleitung

Km 28.0 - 28.



- ☐ Bestehende Anlage / Gleise
- ☐ Grundlagedaten / AV

-  Betrieb offen
 Personenzugang / Bahnbetrieb geschi


Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen		Ausführung Datum: 27.10.2029 - 22.01.2030			
Sperrmuster	Weisen / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / Aus	Bemerkungen, MIZ
W1.1	WN: 4	Täglich 22:05 – 05:20 Uhr	1 Nacht	aus	13.11.2029: Schalter 41 aus
W1.1	WN: 4	Täglich 22:05 – 05:20 Uhr	2 Nächte	aus	13.11.2029 – 16.11.2029: Schalter 41 aus
W3.2	WN: 4 / 3	Täglich 00:10 – 04:30 Uhr	2 Nächte	aus	13.11.2029 – 16.11.2029: Schalter 31 und 41 aus
W3.2	Portal Weesen km 28.859 bis Portal Mühlehorn km 24.900	Täglich 00:10 – 04:30 Uhr	1 Nacht	ein	Umschaltung Kerenzerbergtunnel: 03.12.2029
W1.1	128, WN: 44, 4, 74	Täglich 22:05 – 05:20 Uhr	2 Nächte	ein	22.01.2030 - 23.01.2030
Logistikgleis	Gleis 21/11 (Bahnhof Weesen)	Reservation Datum: 13.11.2029 - 16.11.2030 und 20.01.2030 - 23.01.2030		Länge:	km 30.2 bis km 30.4

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

 AFRY	AFRY Schweiz AG Hengstliasse 12 CH - 8048 Zürich Tel +41 44 355 95 55 info.ch@afry.ch www.afry.ch
	Index
	A Beschreibung
	B Erstaussgabe an Auftraggeber
	C
D	
X (S-BZ/CH/BU Transp)11508710 3132 SBB Line 800 STW-Entzst/Mais Flurs Weesen/300 Prozess/320 Modell/33 Aufbaucorset/100 Plan	


Bauphase 5.1 - Weesen, 1:2000

Km 32.7 - 33.0

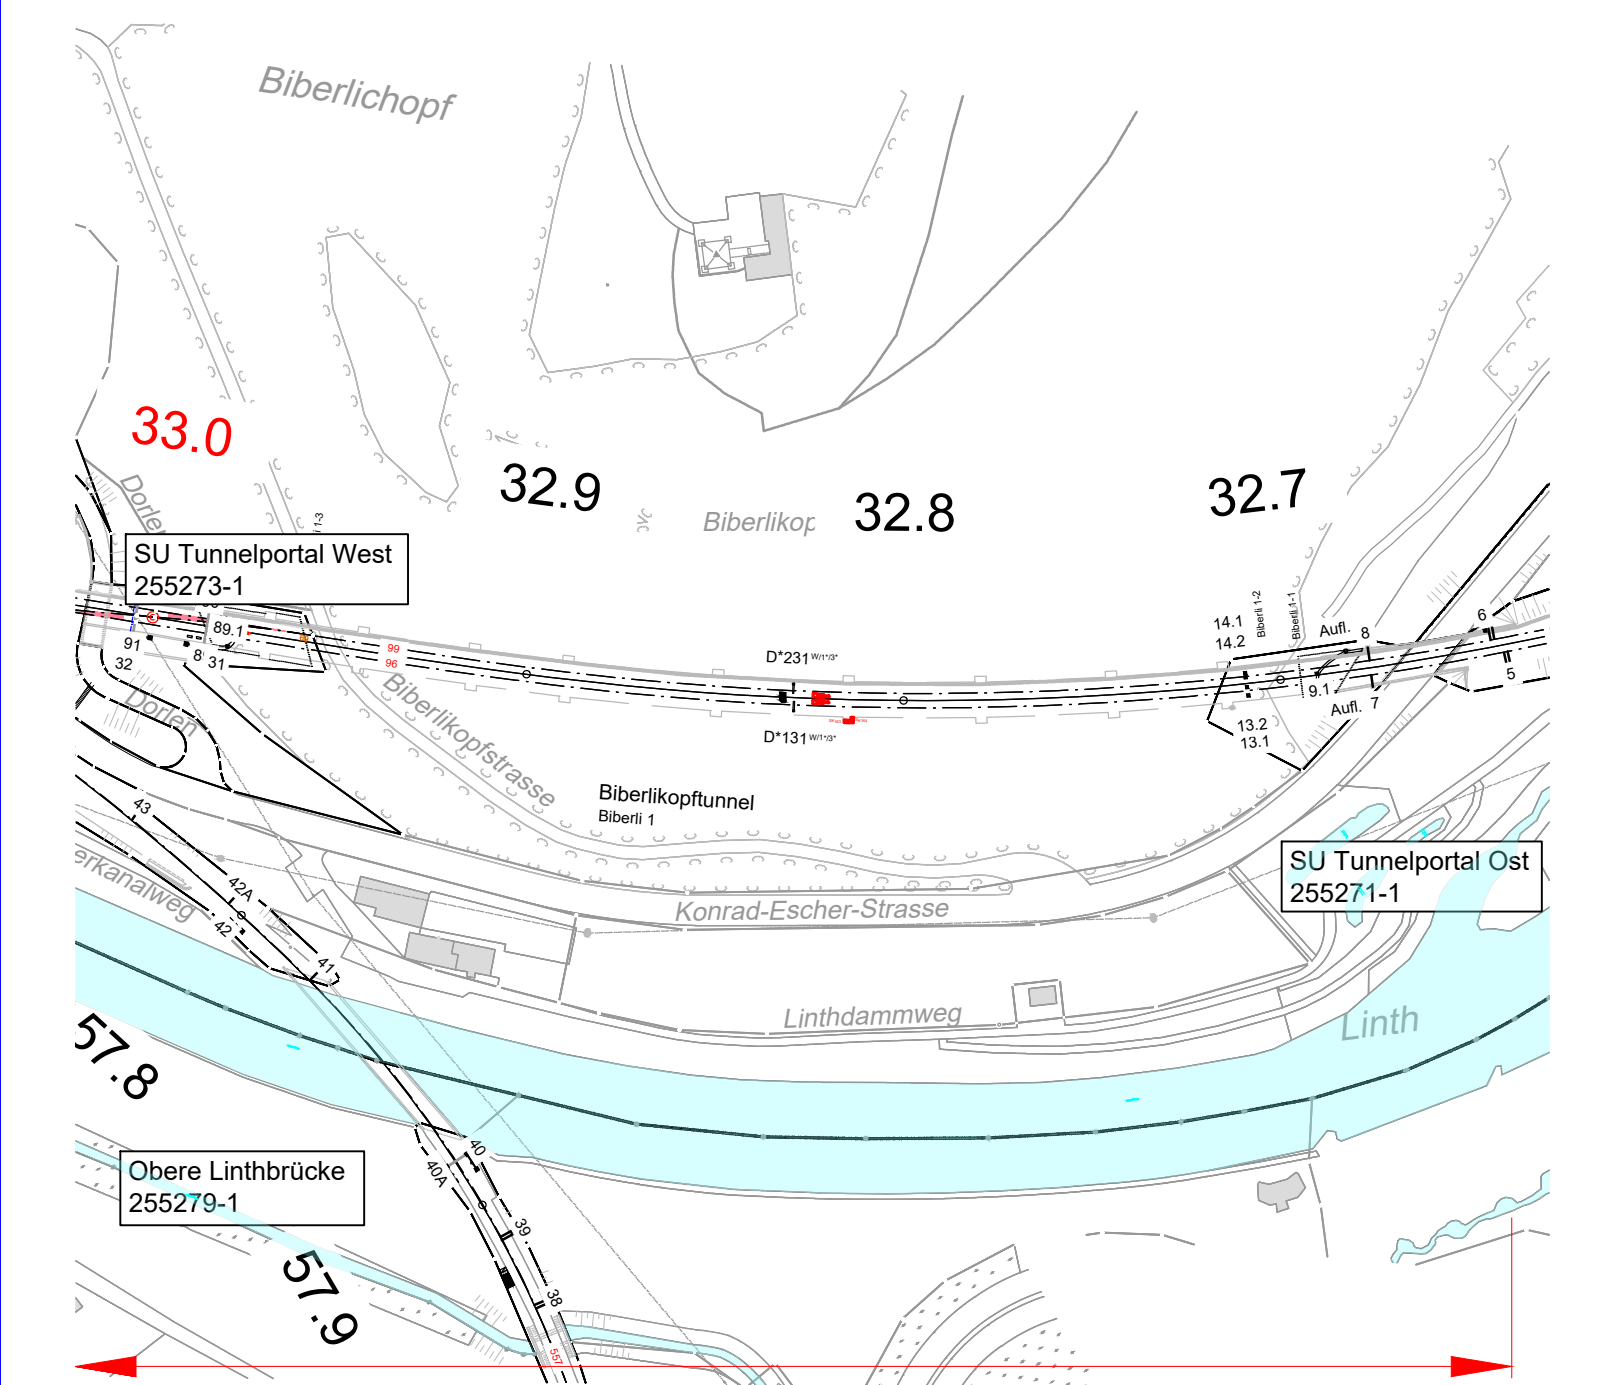

Bauphase 5.1 - Weesen, 1:2000

Km 29.3 - 31.7

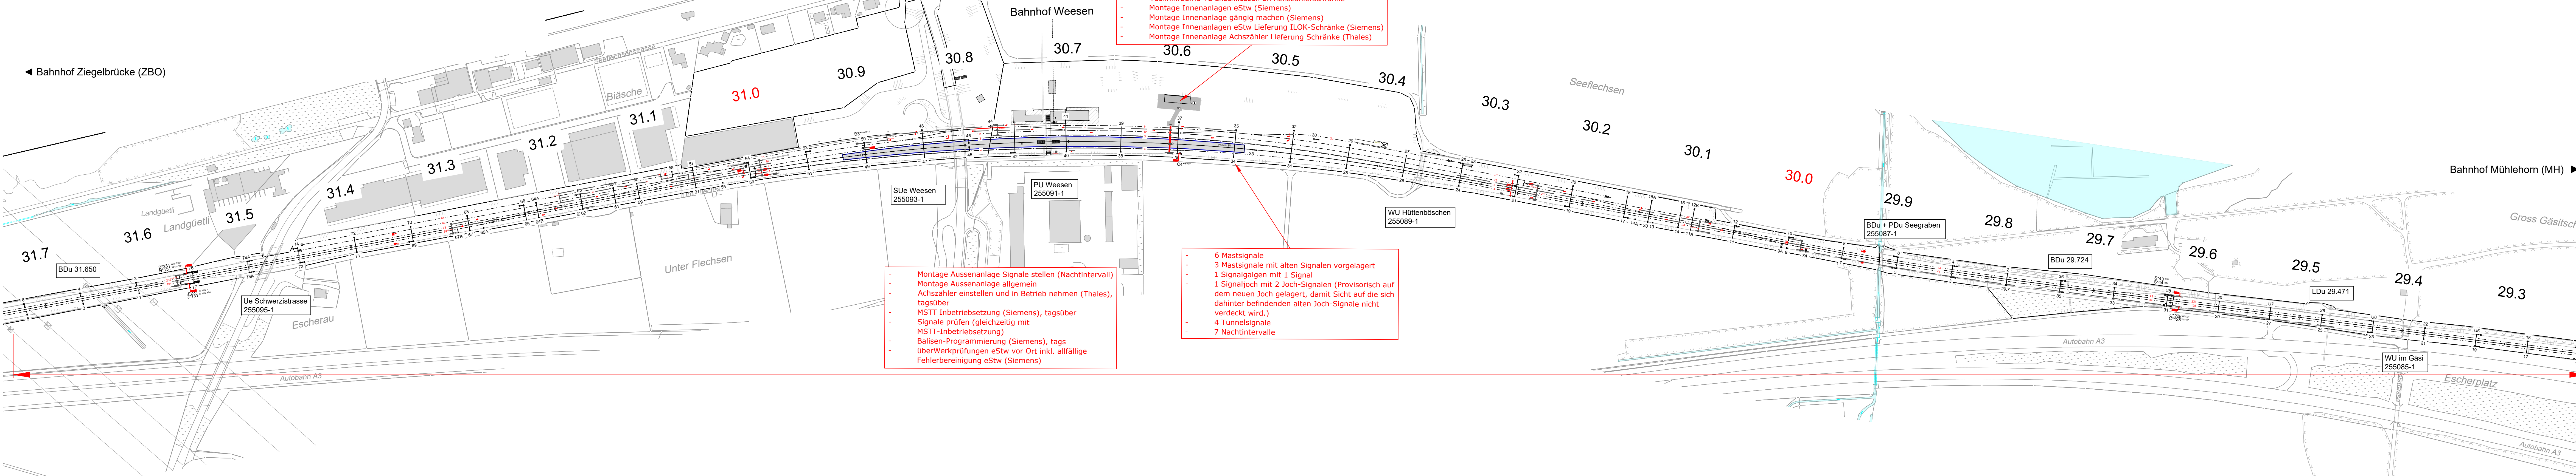

Bauphase 5.1 - Weesen, 1:2000

Km 28.0 - 28.3



Legende

- Bestehende Anlage / Gleise
- Grundlagedaten / AV
- Abbrüche / Gleisabrüche
- Neubauten / Gleisbauten (im Bau)
- Neubauten / neue Gleise erstellt
- Provisorien / prov. Gleise (im Bau)
- Provisorien / prov. Gleise (erstellt)
- Drittprojekte
- Betrieb offen
- Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

01.04.2030 - 06.12.2030

Spermuster

Intervall-Muster «1h Einspur, 4h Totalsperre, 1h Einspur»

Signale stellen (Zeitraum April - Juni 2030)

- WN 5 Nächte

Montage Aussenanlage-Elemente Achszähler, Zwergsignale etc. sowie Balisen-Programmierung (Zeitraum April - Juni 2030)

- WN 5 Nächte

Werkprüfung und SIOP Innen- und Aussenanlage inkl. Blöcke zu Nachbaranlagen (Zeitraum Mitte Oktober - Mitte November 2030)

- WN 5 Nächte

Projektbezeichnung: STW Ersatz Meis, Flums und Weesen		Ausführung Datum: 01.04.2030 - 06.12.2030		FL Ein / Aus	Tiefbauarbeiten
Spermuster	Gleis / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / Aus	Bemerkungen, MIZ
W1.1/W2.1	Gesamter Abschnitt	Täglich 22:05 - 05:20 Uhr	10 Nächte	aus	siehe Legende
W3.2	Gesamter Abschnitt	So/Mo - Do/Fr 23:00 - 05:25	10 Nächte	aus	siehe Legende
Logistikgleis	Gleis 21/11 (Bahnhof Weesen)	Reservationsdatum: 01.04.2030 - 30.06.2030 und 15.10.2030 - 15.11.2030		Länge:	km 30.2 bis km 30.4


Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

AFRY Schweiz AG	
Herstrasse 12 CH - 8048 Zürich Tel: +41 44 355 55 55 info.ch@afry.com www.afry.ch	
Index	Beschrieb
A	Erstausgabe an Auftraggeber
B	
C	
D	


Bauphase 5.2 - Weesen, 1:2000

Km 32.7 - 33.0

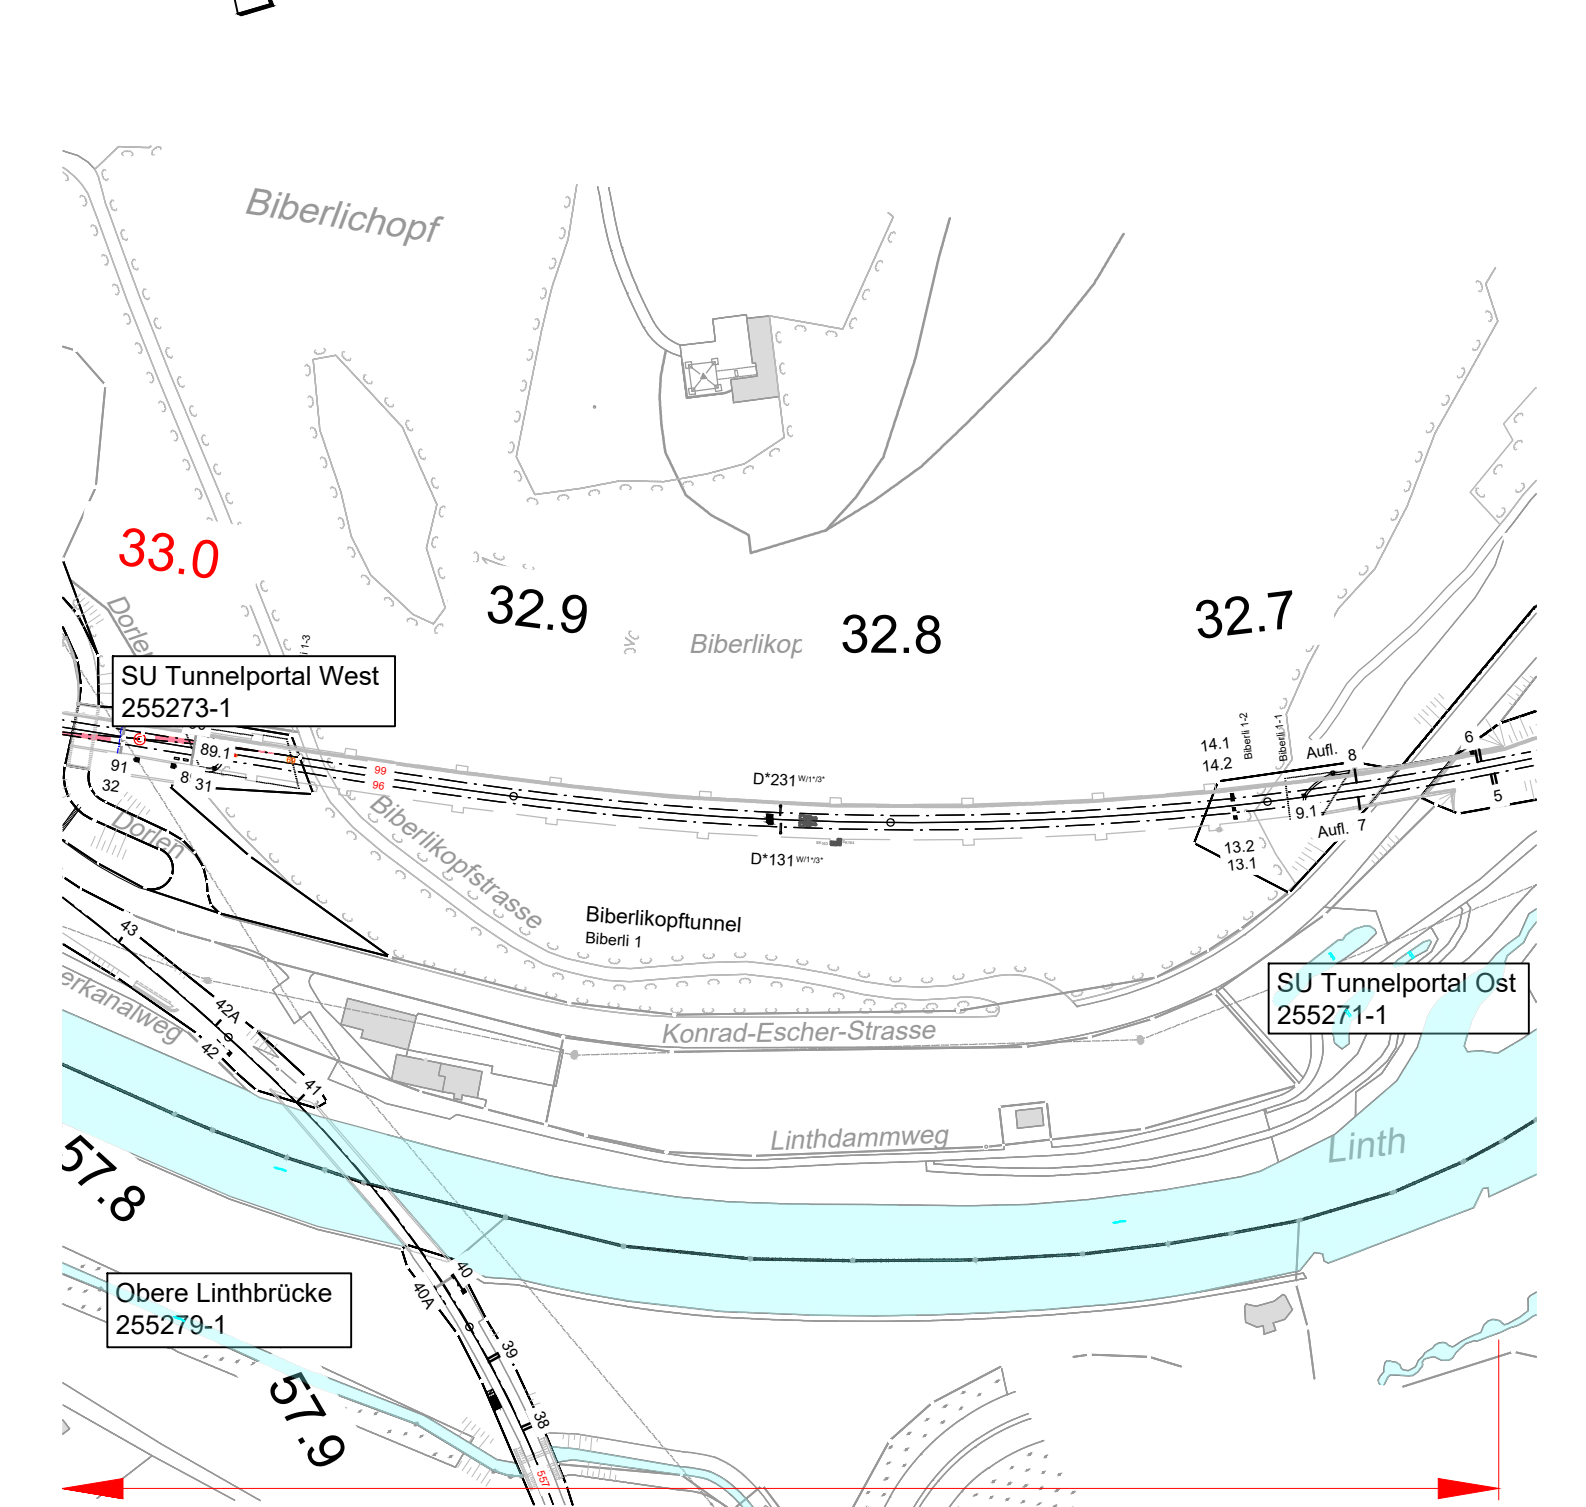


Bauphase 5.2 - Weesen, 1:2000

Km 29.3 - 31.7

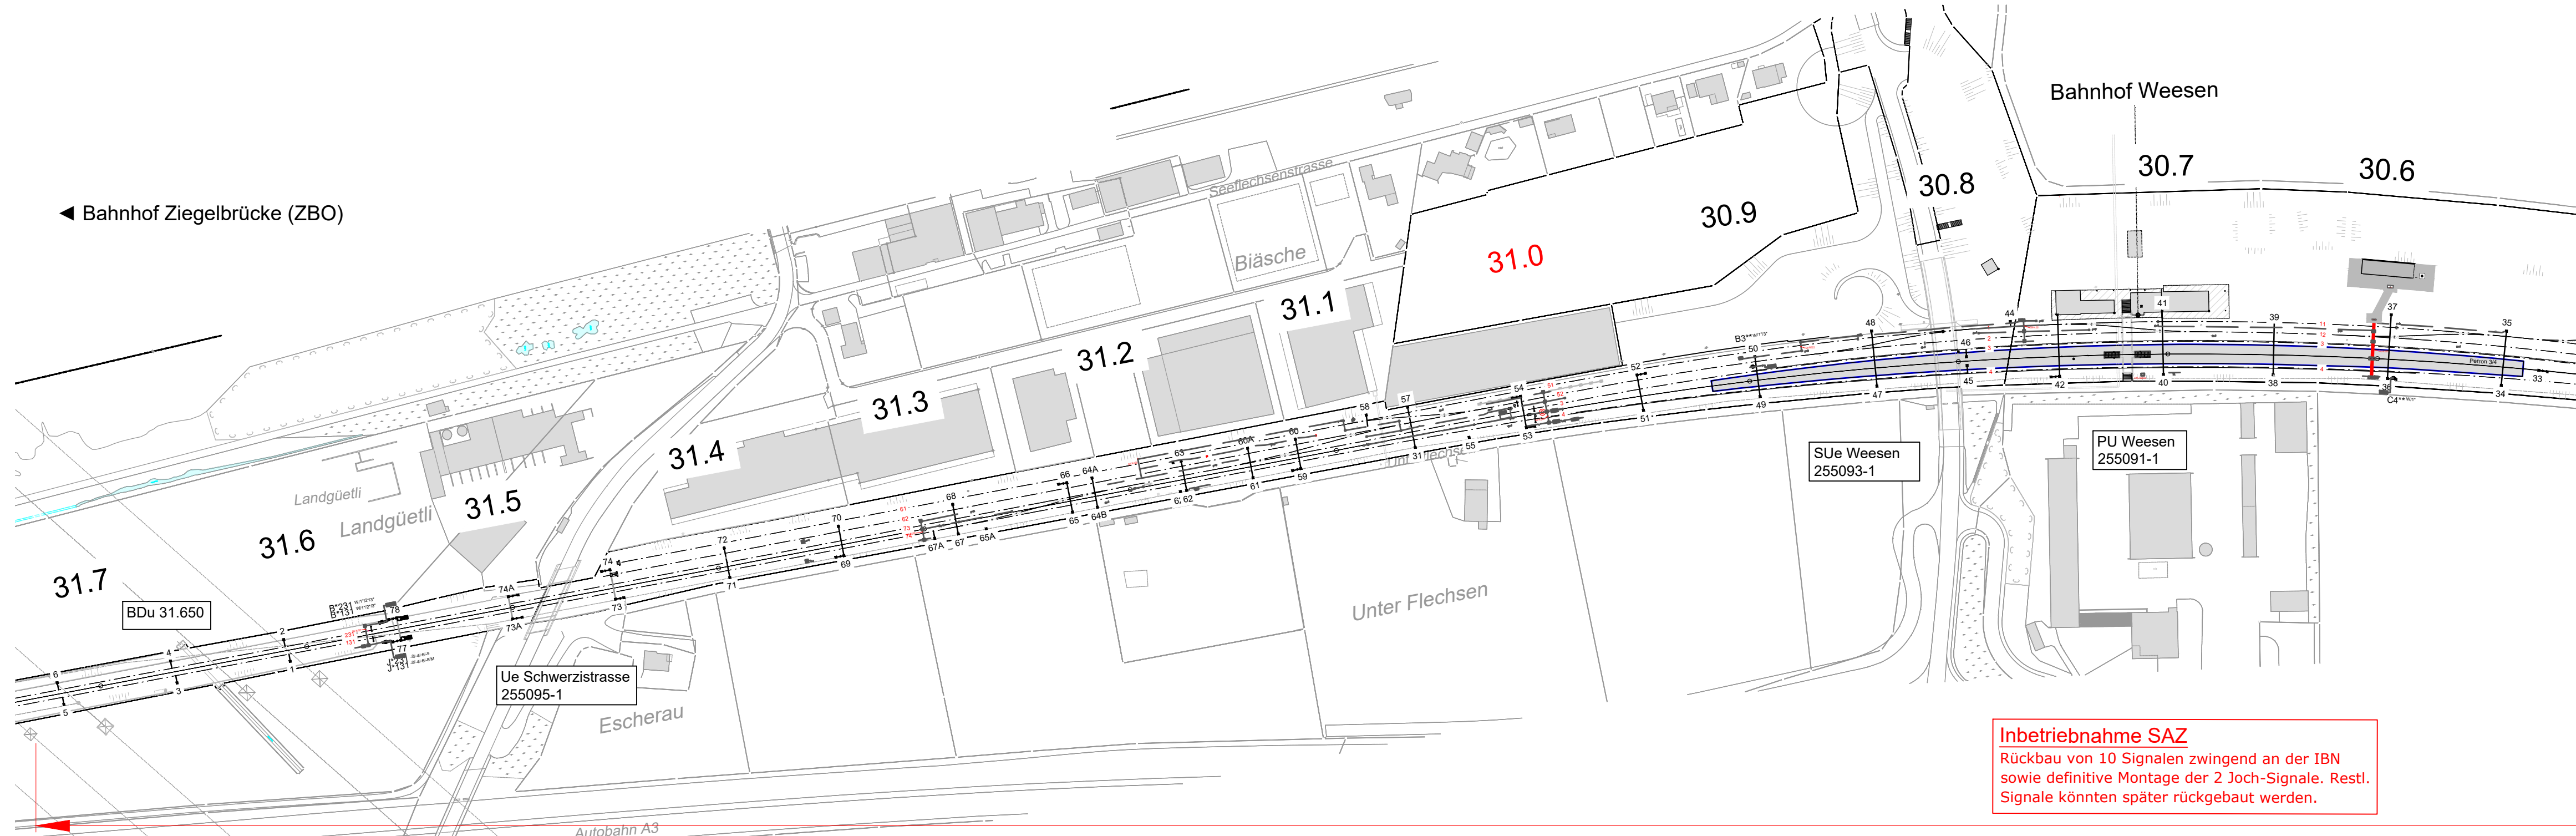


Bauphase 5.2 - Weesen, 1:2000

Km 28.0 - 28.3

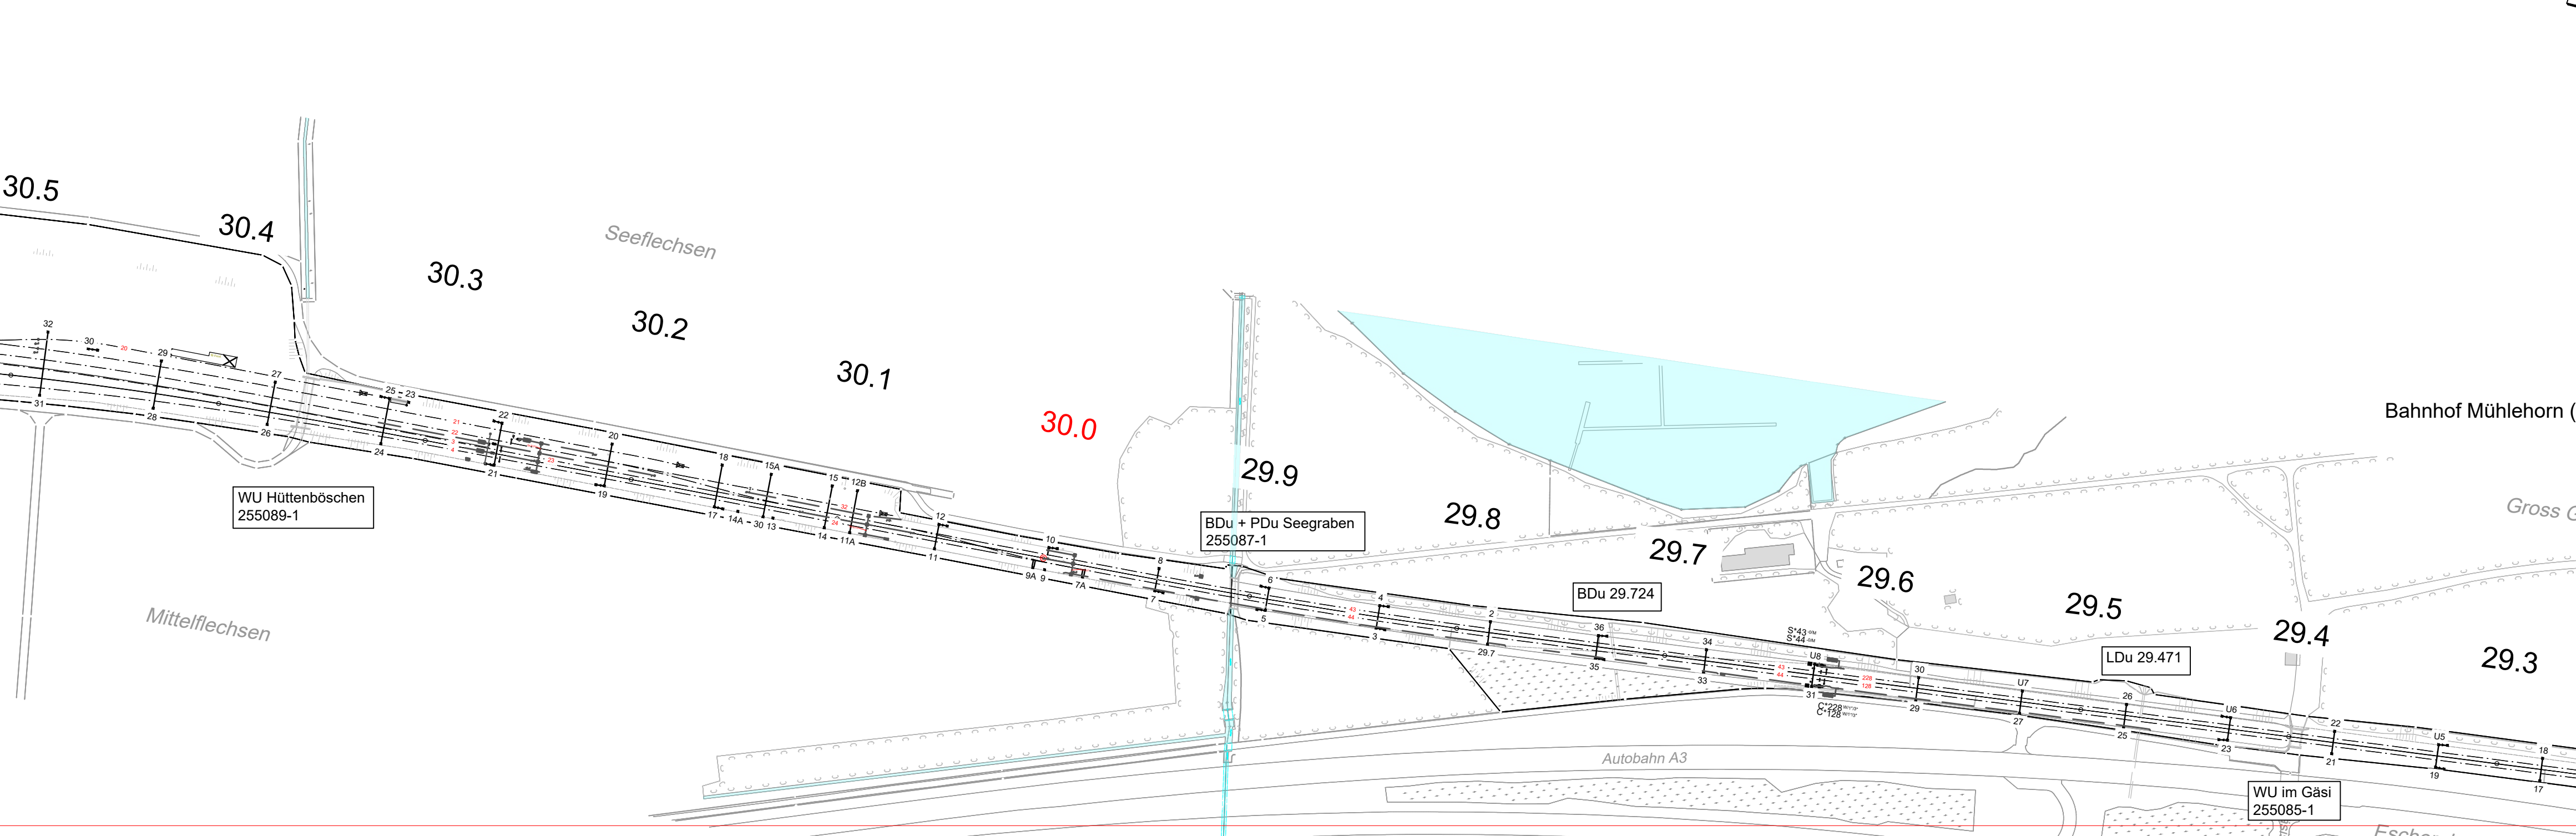

Bauphase 5.2 - Weesen, 1:2000

Km 28.0 - 28.3

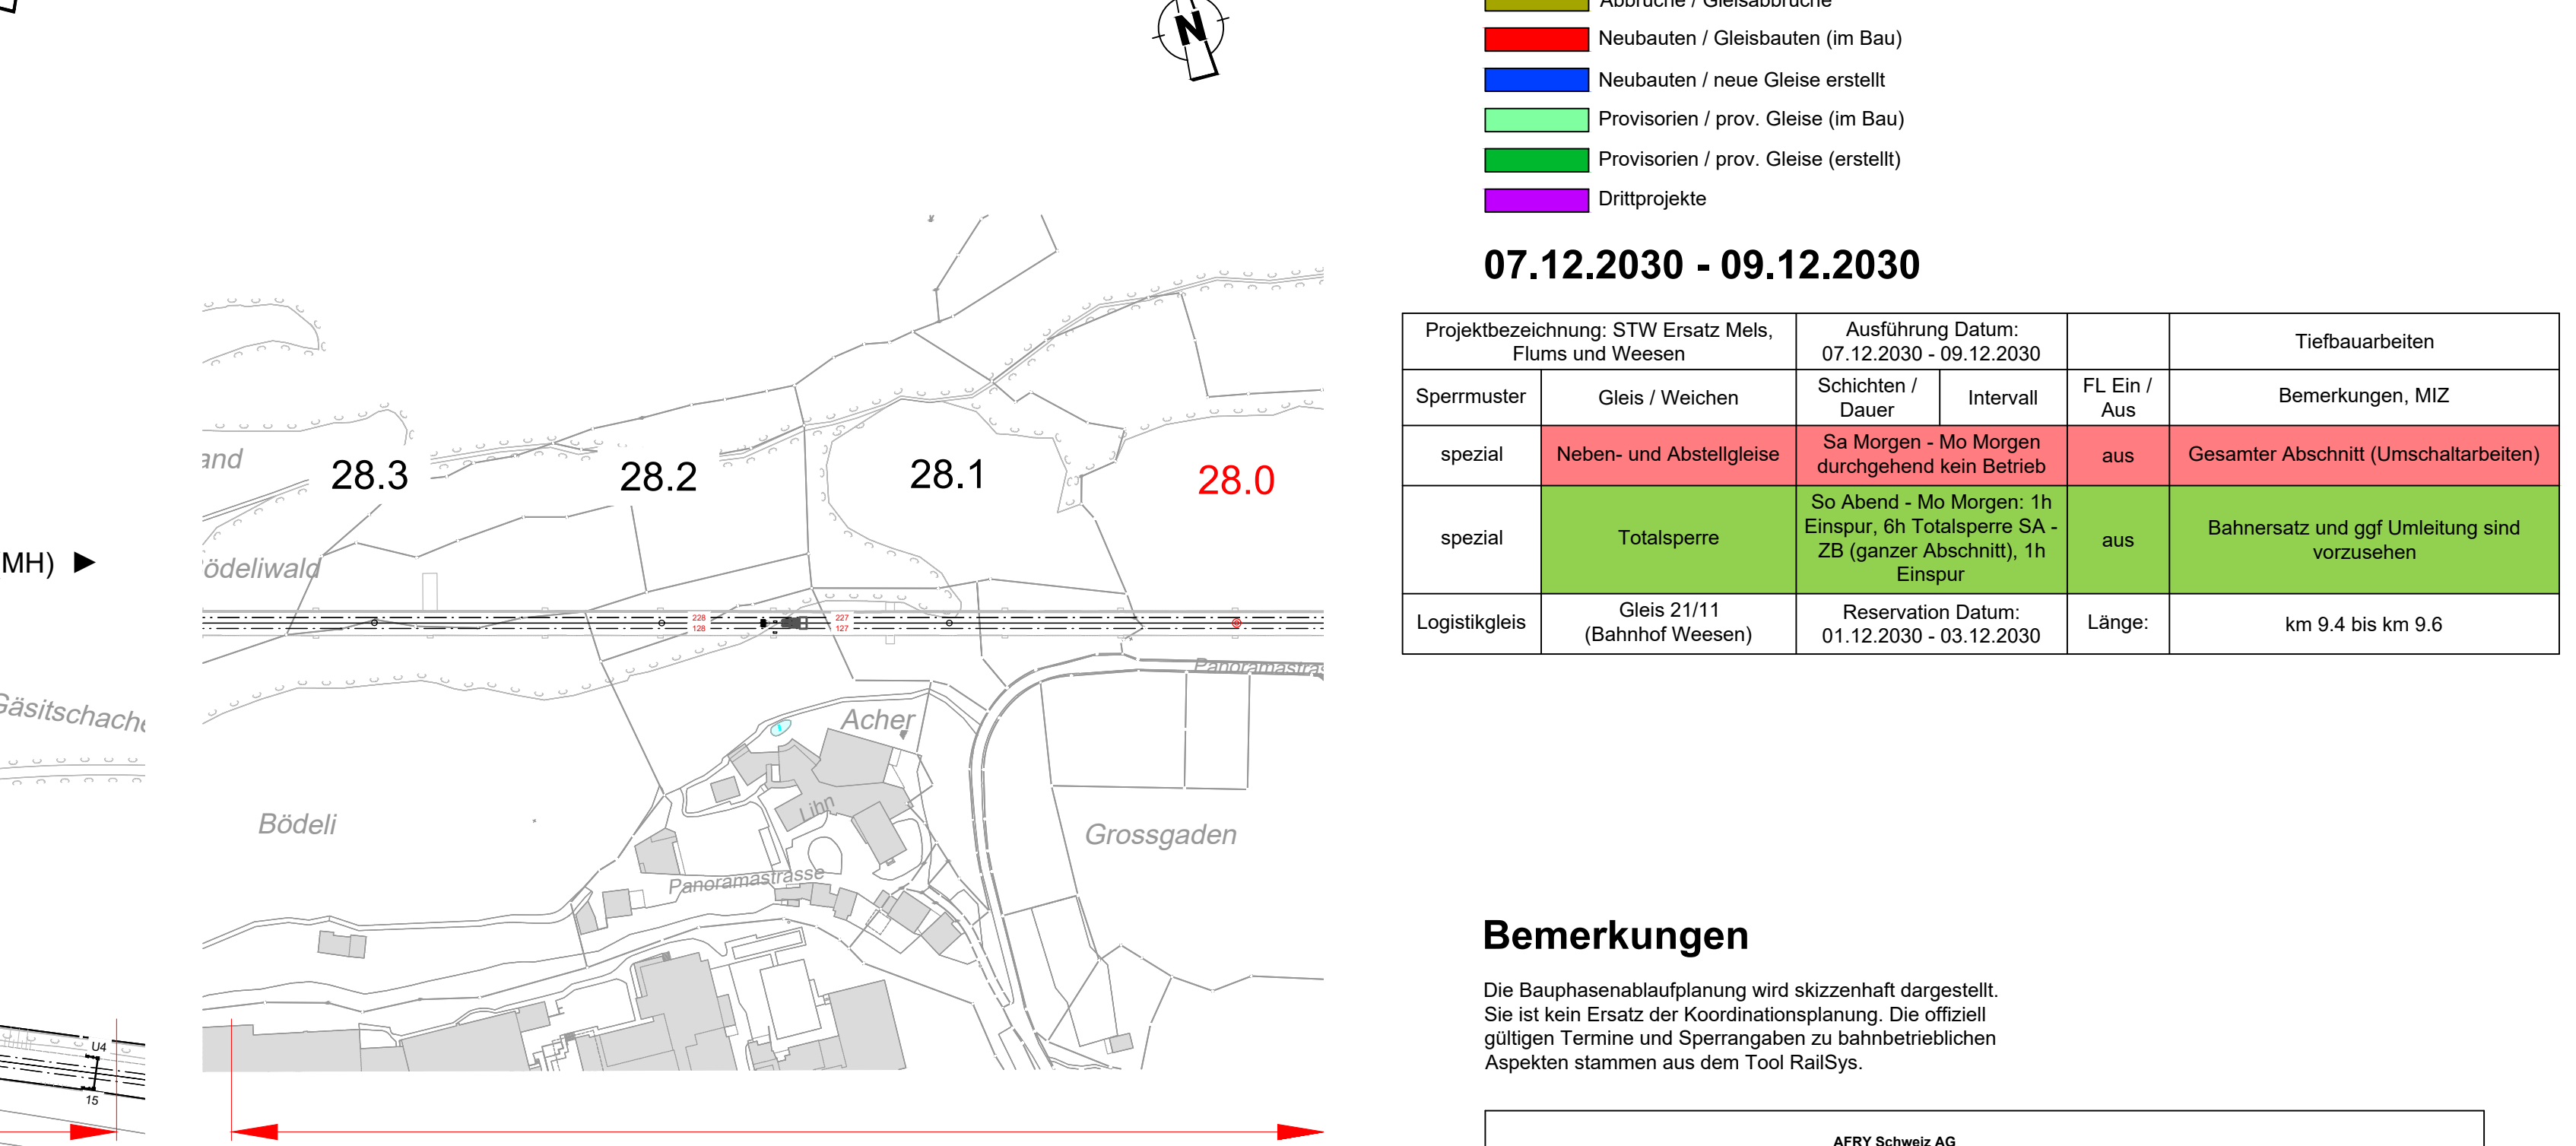

Legende			
	Bestehende Anlage / Gleise		Betrieb offen
	Grundlagedaten / AV		Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen
	Abbrüche / Gleisabbrüche		
	Neubauten / Gleisbauten (im Bau)		
	Neubauten / neue Gleise erstellt		
	Provisorien / prov. Gleise (im Bau)		
	Provisorien / prov. Gleise (erstellt)		
	Drittprojekte		


07.12.2030 - 09.12.2030					
Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen		Ausführung Datum: 07.12.2030 - 09.12.2030		Tiefbauarbeiten	
Sperrmuster	Gleis / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / Aus	Bemerkungen, MIZ
spezial	Neben- und Abstellgleise	Sa Morgen - Mo Morgen durchgehend kein Betrieb		aus	Gesamter Abschnitt (Umschaltarbeiten)
spezial	Totalsperre	So Abend - Mo Morgen: 1h Einspur, 6h Totalsperre SA - ZB (ganzer Abschnitt), 1h Einspur		aus	Bahnersatz und ggf Umleitung sind vorzusehen
Logistikgleis	Gleis 21/11 (Bahnhof Weesen)	Reservation Datum: 01.12.2030 - 03.12.2030		Länge:	km 9.4 bis km 9.6

Bemerkungen

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziell gültigen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

AFRY Schweiz AG Heroldstrasse 12 CH - 8048 Zürich Tel: +41 44 355 55 55 info.ch@afry.com www.afry.ch	
Index	Beschrieb
A	Erstausgabe an Auftraggeber
B	
C	
D	

Km 32.7 - 33.0



n 29.3 - 31.7



Km 28.0 - 28



☐ Bestehende Anlage / Gleise
 ☒ Betrieb offen
 ☐ Grundlagedaten / AV
 ☒ Personenzugang / Bahnbetrieb geschlossen

Projektbezeichnung: STW Ersatz Mels, Flums und Weesen		Ausführung Datum: 01.01.2031 - 29.04.2031		Tiefbau	
Spermuster	Geis / Weichen	Schichten / Dauer	Intervall	FL Ein / aus	Bemerkung
W1.1	Wal: 4, 9, 114, 194, 115, UNT: 11, 1, 91, 120, 121, 122, 123, MH: 31, 41, 1, 71, 126, 127, 128 WN: 4, 4	So/Mo - Do/Fr 23:00 - 05:25	4 Nächte	aus	24.04.2031
W1.1	WN: 4	So/Mo - Do/Fr 23:00 - 05:25	1 Nacht	aus	24.04.2031:

Die Bauphasenablaufplanung wird skizzenhaft dargestellt. Sie ist kein Ersatz der Koordinationsplanung. Die offiziellen Termine und Sperrangaben zu bahnbetrieblichen Aspekten stammen aus dem Tool RailSys.

 **AFRY**

Index	Beschrieb
A	Erstausgabe an Auftraggeber
B	
C	
D	
